

ZONA	SANTA ROSA DE QUIVES	NOMBRE SITE:	SANTA_ROSA_DE_QUIVEZ	CODIGO SITE:	LI0930	FECHA :	2026-05-15 19:29:37
CRQ	CRQ000000067617	COORDENADAS		TÉCNICO RESPONSABLE	Milton Díaz		

I .- INFRAESTRUCTURA

Site:	Modelo:	GREENFIELD			
	Tipo:	OUTDOOR			
Torre:	Tipo:	VENTADA			
	Estado:	OK			
	Altura (m):	25			
	Verticalidad:	OK			
	Pintura:	OK			
	Escalera:	N/A			
	Línea de vida:	OK			
	Cable Vientos:	OK			
	Grapas:	OK			
	Templadores:	OK			
	Base Templadores:	OK			
	Base de Torre:	OK			
Paredes:	OK				
Concertina:	OK				
Puerta:	OK				
Chapa:	OK				


VISTA PANORAMICA DEL SITE

VISTA PARED PERIMETRICA

II .- SUMINISTRO DE ENERGIA AC:

Tipo de Instalacion:	Aérea	
Nivel de Tensión:	LMT	
Sistema de Conexión:	Monofásica	
N° Suministro:	0	
PDP:	Estado:	OK
	Voltaje 1(VAC):	220
	ITM(A):	50
	TVSS	N/A
	Corriente 1(AAC):	0

III .- SUMINISTRO DE ENERGIA DC:

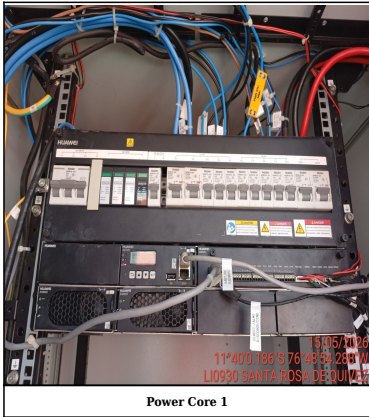Gabinete Rectificador:	Estado:	OK			
	Marca:	HUAWEI			
	Ventiladores:	OK			
	A/A:	OK			
	Filtros:	OK			
Power Core:	Marca:	HUAWEI			
	Modelo:	HUAWEI			
	Controlador:				
	Modelo:	SMU02B			
	Voltaje (VDC):	51			
	Carga (ADC):	9			
	LVBD/BLVD(VDC):	43			
	LVLD/LLVD(VDC):	46			
	Módulos:	Estado:			OK
		Modelo1:			R4850G
Cantidad1:		2			
Bancada Total 1:	Estado:	OK			
	Cantidad:	2			
	Voltaje (V):	51			
	Marca1:	HUAWEI			
	Modelo1:	ESM-48150A1			
	Capacidad1(Ah):	150			
	Autonomia (Hr):	40.9			

IV .- GABINETE DE TRANSMISION:

Gabinete Tx1:

Estado:

Ventiladores:

A/A:

Filtros:

Radios (#):

Routers (#):

Modem (#):

BBU (#):

Switch (#):

Media Converter (#):

OK

OK

OK

OK

1

1

0

0

0

0



Gabinete Tx 1 Abierto



Pasamuro Gabinete Tx 1

V .- BTS:

BBU:

Tipo:

Estado:

FAN:

Cable FO:

NA

N/A

N/A

Estado:

Banda 1 (MHz):

Cantidad:

VSWR:

Alarmas Externas:

Alarmas Internas:

N/A


0

0


N/A

N/A


N/A




Panoramica de BBU1



Alarmas Internas BBU1

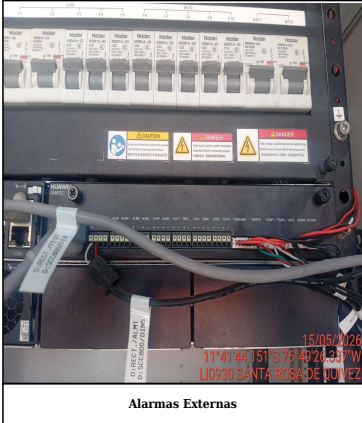

Alarmas Externas



VSWR



Tilt Eléctrico

VI .- SISTEMA RADIANTE:

Antenas:

Sectoriales TDD: Estado: N/A
Cantidad: 0
Modelo: NV
Tilt m.1(*): N/A

Microondas: Estado: OK
Cantidad: 1



Torre



Vulcanizado Conectores S1



Vulcanizado Conectores S2



Vulcanizado Conectores S3

RRU Cantidad: 0
Conectores: OK
Cables RF/IF: OK

Luz de Balizaje: Estado: OK
Cantidad: 0

Pararrayos: Estado: OK

VII.- SISTEMA DE PUESTA A TIERRA:

Estado: OK
Tipo: PARRES
Cantidad: 0
Resistencia (Ω) 1.43
Topologia : MALLA



Resistencia de SPAT



Pozo a tierra

VIII.- IMAGENES FINALES:



Foto Panorámica del Interior del Site



Resistencia de SPAT



Pozo a tierra

IX.- OBSERVACIONES FINALES:

NA

N/A

Observacion 1
