

ZONA	PACHANGARA	NOMBRE SITE:	HUANCAHUASI	CODIGO SITE:	LI5581	FECHA :	2026-05-29 03:06:11
CRQ	CRQ000000073790	COORDENADAS	TÉCNICO RESPONSABLE		Jesus Espinoza		

I .- INFRAESTRUCTURA

Site:	Modelo:	greenfield		
	Tipo:	indoor		
Torre:	Tipo:	AUTOSOPORTADA		
	Estado:	OK		
	Altura (m):	30		
	Verticalidad:	OK		
	Pintura:	OK		
	Escalera:	OK		
	Línea de vida:	OK		
	Cable Vientos:	N/A		
	Grapas:	N/A	VISTA PANORAMICA DEL SITE	VISTA PARED PARIMETRICA
	Templadores:	N/A		
	Base Templadores:	N/A		
	Base de Torre:	OK		
Paredes:	OK			
Concertina:	OK			
Puerta:	OK			
Chapa:	OK			

II .- SUMINISTRO DE ENERGIA AC:


Tipo de Instalacion:	Aérea	
Nivel de Tensión:	LMT	
Sistema de Conexión:	Monofásica	
N° Suministro:	nv	
PDP:	Estado:	OK
	Voltaje 1(VAC):	220
	ITM(A):	50
	TVSS	OK
	Corriente 1(AAC):	12



24/05/2026
10:54:23.772 10:55:48.042 00
LISSEI HUANCATAMAYO

PDP

III .- SUMINISTRO DE ENERGIA DC:

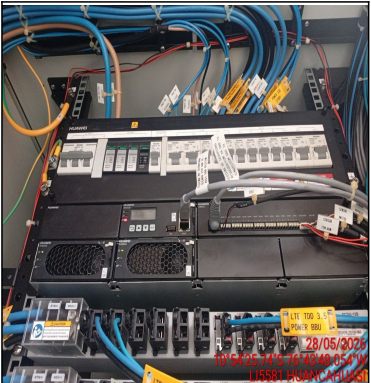Gabinete Rectificador:	Estado:	OK		
	Marca:	Huawei		
	Ventiladores:	OK		
	A/A:	OK		
	Filtros:	OK		
Power Core:	Marca:	Huawei		
	Modelo:	MTS9000A		
	Controlador:	Modelo: SMU02B		
		Voltaje (VDC): 51		
		Carga (ADC): 12		
		LVBD/BLVD(VDC):45	Rectificador 1	Power Core 1
		LVLd/LLVD(VDC): 47		
	Módulos:	Estado: OK		
		Modelo1: R4850G		
		Cantidad1: 2		
Bancada Total 1:	Estado:	OK		
	Cantidad:	2		
	Voltaje (V):	51		
	Marca1:	Huawei		
	Modelo1:	ESM48150A1		
	Capacidad1(Ah):	300		
	Autonomia (Hr):	15		

IV .- GABINETE DE TRANSMISION:

Gabinete Tx1:

Estado:	OK
Ventiladores:	OK
A/A:	OK
Filtros:	OK
Radio (#):	1
Routers (#):	1
Modem (#):	1
BBU (#):	1
Switch (#):	1
Media Converter (#):	1



Gabinete Tx 1 Abierto



Pasamuro Gabinete Tx 1


V .- BTS:

BBU:

Tipo:	5900
Estado:	OK
FAN:	OK
Cable FO:	Estado: OK
	Banda 1 (MHz): 3500
	Cantidad: 1
	VSWR: OK
	Alarmas Externas: OK
	Alarmas Internas: OK




Panoramica de BBU1

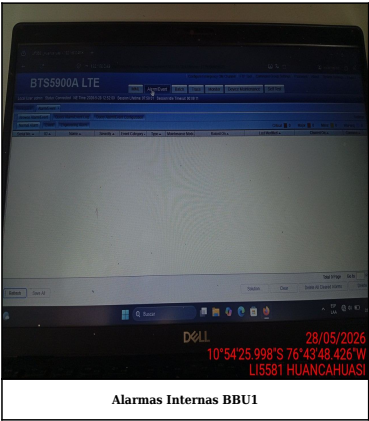


Alarmas Internas BBU1



Alarmas Externas

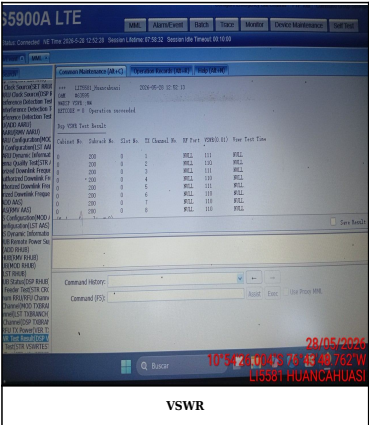

VSWR

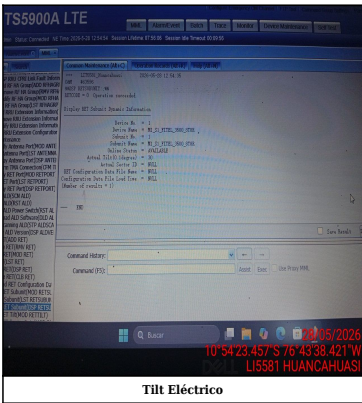

Tilt Eléctrico

VI .- SISTEMA RADIANTE:

Antenas:

Sectoriales TDD:	Estado:	OK
	Cantidad:	1
Microondas:	Modelo:	nv
	Tilt m.1(°):	OK
Microondas:	Estado:	OK
	Cantidad:	1



Torre




Vulcanizado Conectores S1

RRU	Cantidad:	1
	Conectores:	OK
	Cables RF/IF:	OK
Luz de Balizaje:	Estado:	N/A
	Cantidad:	0
Pararrayos:	Estado:	OK



Vulcanizado Conectores S2

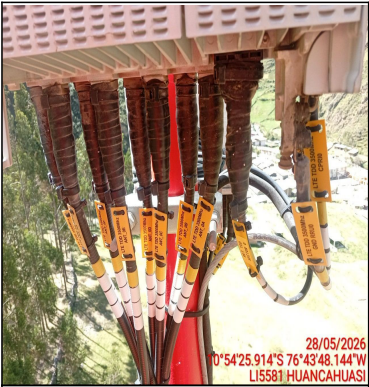

Vulcanizado Conectores S3

VII.- SISTEMA DE PUESTA A TIERRA:

Estado:	OK
Tipo:	unico
Cantidad:	1
Resistencia (Ω)	3.11
Topologia :	único



Resistencia de SPAT



Pozo a tierra

VIII.- IMAGENES FINALES:



Foto Panorámica del Interior del Site



Resistencia de SPAT



Pozo a tierra

IX.- OBSERVACIONES FINALES:

n.a

N/A

Observacion 1
