

ZONA	SURCO	NOMBRE SITE:	SURCO	CODIGO SITE:	LI5254	FECHA :	2026-06-10 19:51:48
CRQ	CRQ000000081434	COORDENADAS	11°5'38.558"S 76°26'30.731"W	TÉCNICO RESPONSABLE	Adrian Paucar		

I .- INFRAESTRUCTURA

Site:	Modelo:	Greenfield		
	Tipo:	Indoor		
Torre:	Tipo:	Triángular autosoportada		
	Estado:	OK		
	Altura (m):	25		
	Verticalidad:	OK		
	Pintura:	OK		
	Escalera:	OK		
	Línea de vida:	OK		
	Cable Vientos:	N/A		
	Grapas:	N/A		
	Templadores:	N/A		
	Base Templadores:	N/A		
	Base de Torre:	OK		
Paredes:	OK			
Concertina:	OK			
Puerta:	OK			
Chapa:	OK			


VISTA PANORAMICA DEL SITE

VISTA PARED PERIMETRICA

II .- SUMINISTRO DE ENERGIA AC:

Tipo de Instalacion:	Aérea	
Nivel de Tensión:	LBT	
Sistema de Conexión:	Monofásica	
N° Suministro:	No visible	
PDP:	Estado:	OK
	Voltaje 1(VAC):	224
	ITM(A):	50
	TVSS	OK
	Corriente 1(AAC):	10.3

III .- SUMINISTRO DE ENERGIA DC:

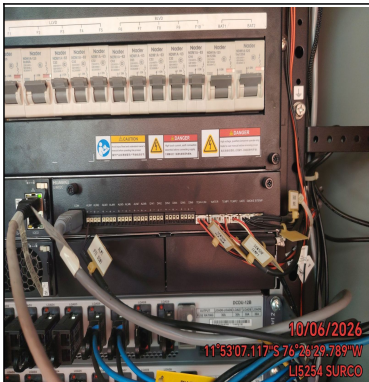Gabinete Rectificador:	Estado:	OK			
	Marca:	Huawei			
	Ventiladores:	OK			
	A/A:	OK			
	Filtros:	OK			
Power Core:	Marca:	Huawei			
	Modelo:	MTS9000A			
	Controlador:				
	Modelo:	Huawei			
	Voltaje (VDC):	51			
	Carga (ADC):	11.3			
	LVBD/BLVD(VDC):	43			
	LVLVD/LLVD(VDC):	47			
	Módulos:	Estado:	OK		
		Modelo1:	R4850G		
		Cantidad1:	2		
Bancada Total 1:	Estado:	OK			
	Cantidad:	3			
	Voltaje (V):	48.9			
	Marca1:	Huawei			
	Modelo1:	ESM-48150A1			
	Capacidad1(Ah):	150			
	Autonomia (Hr):	32.2			


IV .- GABINETE DE TRANSMISION:

Gabinete Tx1:

Estado:	OK
Ventiladores:	OK
A/A:	OK
Filtros:	OK
Radios (#):	1
Routers (#):	0
Modem (#):	0
BBU (#):	1
Switch (#):	0
Media Converter (#):	0



Gabinete Tx 1 Abierto

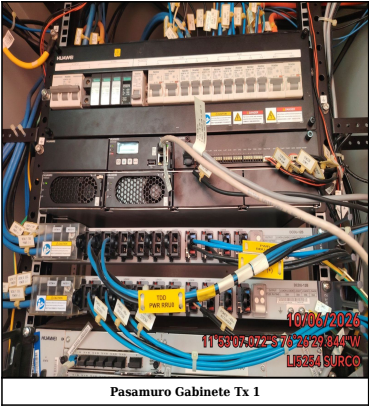


Pasamuro Gabinete Tx 1


V .- BTS:

BBU:

Tipo:	5900
Estado:	OK
FAN:	OK
Cable FO:	Estado: OK
	Banda 1 (MHz): 35
	Cantidad: 1
VSWR: OK	
Alarmas Externas: OK	
Alarmas Internas: OK	

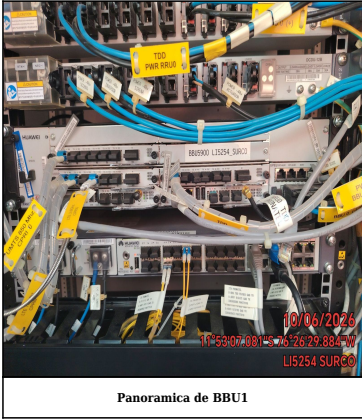


Panoramica de BBU1

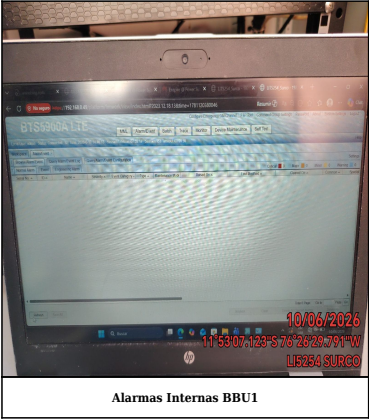


Alarmas Internas BBU1



Alarmas Externas

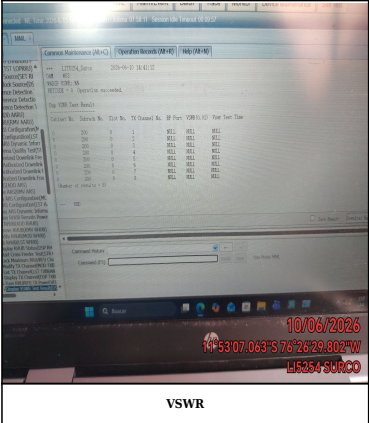

VSWR

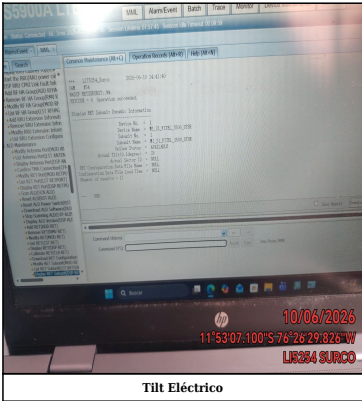

Tilt Eléctrico

VI .- SISTEMA RADIANTE:

Antenas:

Sectoriales TDD:	Estado:	OK
	Cantidad:	0
	Modelo:	No visible
	Tilt m.1(*):	OK

Microondas:	Estado:	N/A
	Cantidad:	0



Torre



Vulcanizado Conectores S1

RRU	Cantidad:	1
	Conectores:	OK
	Cables RF/IF:	OK

Luz de Balizaje:	Estado:	N/A
	Cantidad:	0

Pararrayos:	Estado:	OK
-------------	---------	----



Vulcanizado Conectores S2



Vulcanizado Conectores S3

VII.- SISTEMA DE PUESTA A TIERRA:

Estado:	OK
Tipo:	Parres
Cantidad:	4
Resistencia (Ω)	1.88
Topologia :	Malla



Resistencia de SPAT



Pozo a tierra

VIII.- IMAGENES FINALES:



Foto Panorámica del Interior del Site



Resistencia de SPAT



Pozo a tierra

IX.- OBSERVACIONES FINALES:

Ok

N/A

Observacion 1
