

ZONA	CARANIA	NOMBRE SITE:	CARANIA	CODIGO SITE:	LI5613	FECHA :	2026-06-18 18:15:35
CRQ	CRQ000000085583	COORDENADAS	12°	TÉCNICO RESPONSABLE	Alcides Guevara		

I .- INFRAESTRUCTURA

Site:	Modelo:	GREENFIELD		
	Tipo:	INDOOR		
Torre:	Tipo:	AUTOSOPORTA		
	Estado:	OK		
	Altura (m):	25		
	Verticalidad:	OK		
	Pintura:	OK		
	Escalera:	OK		
	Línea de vida:	OK		
	Cable Vientos:	N/A		
	Grapas:	N/A		
	Templadores:	N/A		
	Base Templadores:	N/A		
	Base de Torre:	OK		
Paredes:	OK			
Concertina:	OK			
Puerta:	OK			
Chapa:	OK			

VISTA PANORAMICA DEL SITE


VISTA PARED PARIMETRICA

II .- SUMINISTRO DE ENERGIA AC:

Tipo de Instalacion:	Aérea		
Nivel de Tensión:	LBT		
Sistema de Conexión:	Monofásica		
N° Suministro:	NA		
PDP:	Estado:		OK
	Voltaje 1(VAC):		217
	ITM(A):		32
	TVSS		OK
	Corriente 1(AAC):		5.7

PDP

III .- SUMINISTRO DE ENERGIA DC:

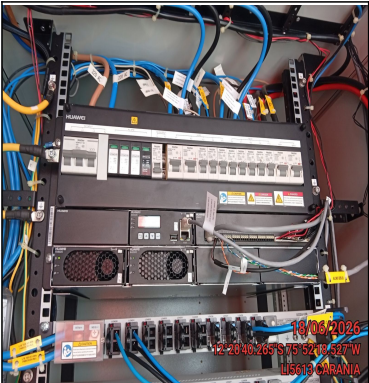Gabinete Rectificador:	Estado:	OK		
	Marca:	HUAWEI		
	Ventiladores:	OK		
	A/A:	OK		
	Filtros:	OK		
Power Core:	Marca:	HUAWEI		
	Modelo:	ETP-48200A		
	Controlador:	Modelo: SMU02B		
		Voltaje (VDC): 51		
		Carga (ADC): 11		
		LVBD/BLVD(VDC):41		
		LVLVD/LLVD(VDC): 46		
	Módulos:	Estado: OK		
		Modelo1: R4850G		
		Cantidad1: 2		
Bancada Total 1:	Estado:	OK		
	Cantidad:	3		
	Voltaje (V):	51		
	Marca1:	HUAWEI		
	Modelo1:	ESM-48150A1		
	Capacidad1(Ah):	150		
	Autonomia (Hr):	28		

Rectificador 1


Power Core 1

IV .- GABINETE DE TRANSMISION:

Gabinete Tx1: Estado: OK
Ventiladores: OK
A/A: OK
Filtros: OK
Radios (#): 0
Routers (#): 1
Modem (#): 0
BBU (#): 1
Switch (#): 0
Media Converter (#): 0



Gabinete Tx 1 Abierto

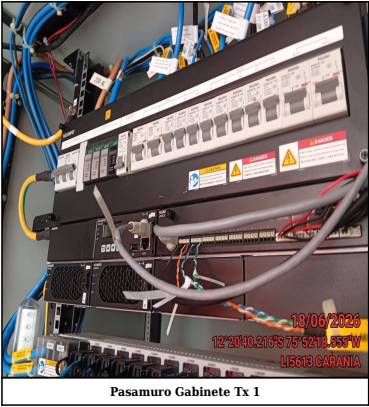

Pasamuro Gabinete Tx 1


V .- BTS:

BBU: Tipo: BBU5900
Estado: OK
FAN: OK
Cable FO: Estado: OK
Banda 1 (MHz): 3500
Cantidad: 1

VSWR: OK
Alarmas Externas: OK
Alarmas Internas: OK




Panoramica de BBU1

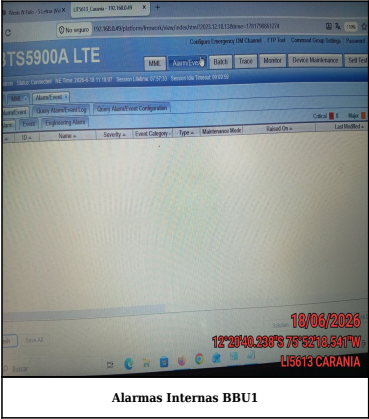


Alarmas Internas BBU1



Alarmas Externas

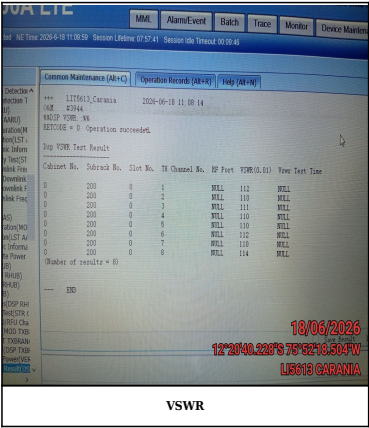

VSWR

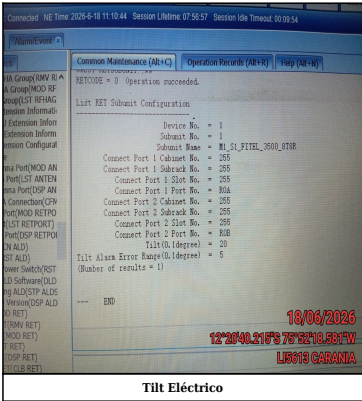

Tilt Eléctrico

VI .- SISTEMA RADIANTE:

Antenas:

Sectoriales TDD:

Estado:
Cantidad:
Modelo:
Tilt m.1(°):

OK
1
ATD
OK

Microondas:

Estado:
Cantidad:

N/A
0

RRU

Cantidad:
Conectores:
Cables RF/IF:

1
OK
OK

Luz de Balizaje:

Estado:
Cantidad:

N/A
0

Pararrayos:

Estado:

OK




Torre



Vulcanizado Conectores S1



Vulcanizado Conectores S2



Vulcanizado Conectores S3

VII.- SISTEMA DE PUESTA A TIERRA:

Estado:

Tipo:

Cantidad:

Resistencia (Ω):

Topologia :

OK
malla
3
2.17
horizontal



Resistencia de SPAT



Pozo a tierra


VIII.- IMAGENES FINALES:



Foto Panorámica del Interior del Site



Resistencia de SPAT

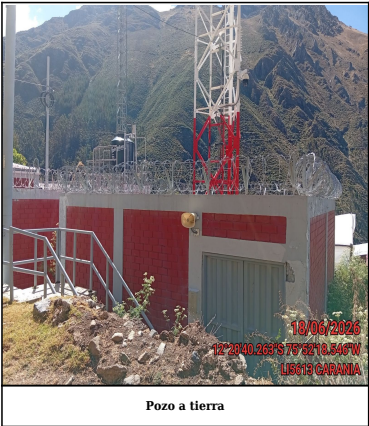

Pozo a tierra

IX.- OBSERVACIONES FINALES:

NA

N/A

Observacion 1
