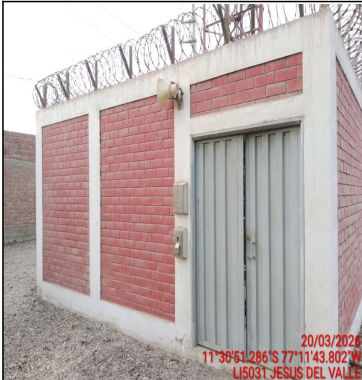
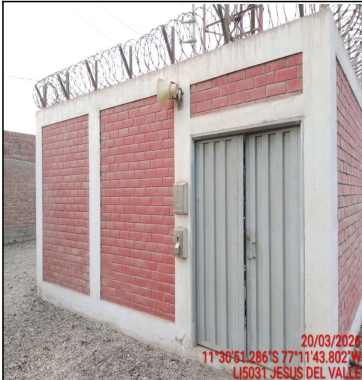
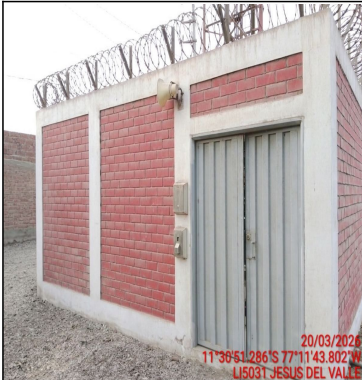
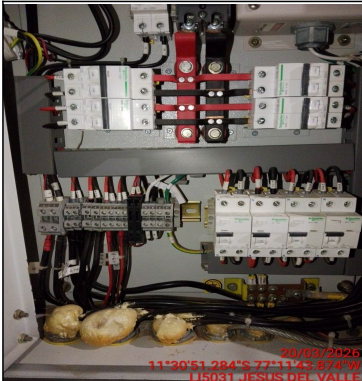
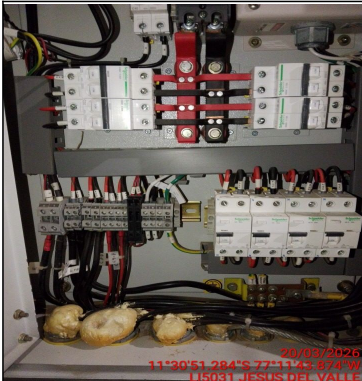


ZONA	HUARAL	NOMBRE SITE:	JESUS_DEL_VALLE	CODIGO SITE:	LI5031	FECHA :	2026-03-21 12:26:14
CRQ	CRQ000000042508	COORDENADAS	11°30'51.81"S 77°11'44.334"W	TÉCNICO RESPONSABLE	Jesus Ramos		



I .- INFRAESTRUCTURA

Site:	Modelo:	GREENFIELD		
	Tipo:	OUTDOOR		
Torre:	Tipo:	AUTOSOPORTADA		
	Estado:	OK		
	Altura (m):	30		
	Verticalidad:	OK		
	Pintura:	OK		
	Escalera:	OK		
	Línea de vida:	OK		
	Cable Vientos:	N/A		
	Grapas:	N/A		
	Templadores:	N/A		
	Base Templadores:	N/A		
	Base de Torre:	OK		
Paredes:	OK			
Concertina:	OK			
Puerta:	OK			
Chapa:	OK			

II .- SUMINISTRO DE ENERGIA AC:

Tipo de Instalacion:	Aérea	
Nivel de Tensión:	LBT	
Sistema de Conexión:	Monofásica	
N° Suministro:	NV	
PDP:	Estado: OK	
	Voltaje 1(VAC): 0	
	ITM(A): 50	
	TVSS OK	
	Corriente 1(AAC): 0	

III .- SUMINISTRO DE ENERGIA DC:

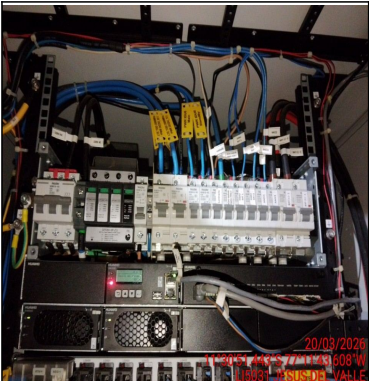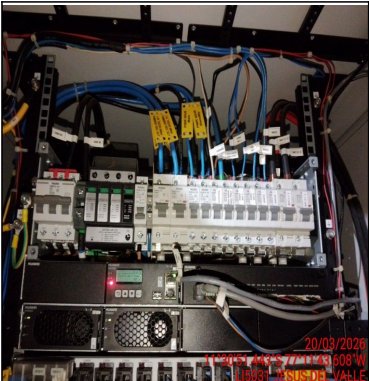
Gabinete Rectificador:	Estado: OK		
	Marca: HUAWEI		
	Ventiladores: OK		
	A/A: OK		
	Filtros: OK		
Power Core:	Marca: HUAWEI		
	Modelo: HUAWEI		
	Controlador:		
	Modelo: SMU02B		
	Voltaje (VDC): 51		
	Carga (ADC): 20		
	LVBD/BLVD(VDC):43		
	LVLd/LLVD(VDC): 46		
	Módulos:	Estado: OK	
	Modelo1: R4850G		
	Cantidad1: 2		
Bancada Total 1:	Estado: OK		
	Cantidad: 2		
	Voltaje (V): 51		
	Marca1: OTROS		
	Modelo1: ESM-48150A1		
	Capacidad1(Ah): 150		
	Autonomia (Hr): 4		

IV .- GABINETE DE TRANSMISION:

Gabinete Tx1:	Estado:	OK
	Ventiladores:	OK
	A/A:	OK
	Filtros:	OK
	Radios (#):	1
	Routers (#):	1
	Modem (#):	0
	BBU (#):	1
	Switch (#):	0
	Media Converter (#):	1




Gabinete Tx 1 Abierto

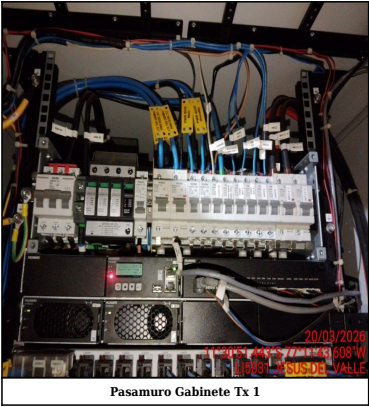


Pasamuro Gabinete Tx 1

V .- BTS:

BBU:	Tipo:	BBU5900
	Estado:	OK
	FAN:	OK
	Cable FO:	Estado: OK
		Banda 1 (MHz): 0
		Cantidad: 0
		VSWR: OK
		Alarmas Externas: OK
		Alarmas Internas: OK

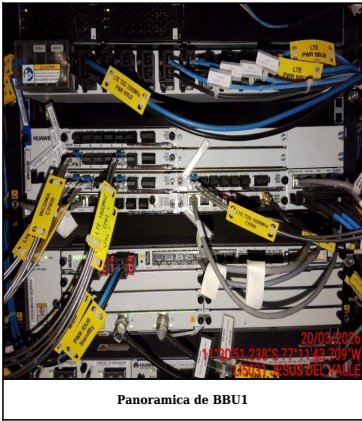


Panoramica de BBU1

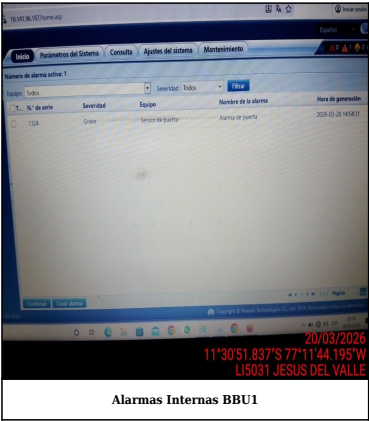

Alarmas Internas BBU1



Alarmas Externas



VSWR



Tilt Eléctrico

VI .- SISTEMA RADIANTE:


Antenas:

Sectoriales TDD: Estado: OK
Cantidad: 2
Modelo: NV
Tilt m.1(°): N/A

Microondas: Estado: OK
Cantidad: 3



Torre



Vulcanizado Conectores S1


RRU Cantidad: 6
Conectores: OK
Cables RF/IF: OK

Luz de Balizaje: Estado: OK
Cantidad: 1

Pararrayos: Estado: OK



Vulcanizado Conectores S2



Vulcanizado Conectores S3

VII.- SISTEMA DE PUESTA A TIERRA:

Estado: OK
Tipo: PARRES
Cantidad: 3
Resistencia (Ω) 4
Topologia : MALLA



Resistencia de SPAT



Pozo a tierra

VIII.- IMAGENES FINALES:



Foto Panorámica del Interior del Site



Resistencia de SPAT



Pozo a tierra

IX.- OBSERVACIONES FINALES:

NA

N/A

Observacion 1
