

ZONA	QUINOCAY	NOMBRE SITE:	QUINOCAY_FITEL	CODIGO SITE:	LI5643	FECHA :	2026-03-24 18:52:50
CRQ	CRQ000000043307	COORDENADAS	12°	TÉCNICO RESPONSABLE	Alcides Guevara		

I .- INFRAESTRUCTURA

Site:	Modelo:	GREENFIELD
	Tipo:	OUTDOOR
Torre:	Tipo:	AUTOSOPORTADA
	Estado:	OK
	Altura (m):	15
	Verticalidad:	OK
	Pintura:	OK
	Escalera:	OK
	Línea de vida:	OK
	Cable Vientos:	N/A
	Grapas:	N/A
	Templadores:	N/A
	Base Templadores:	N/A
	Base de Torre:	OK
Paredes:		OK
Concertina:		OK
Puerta:		OK
Chapa:		OK



VISTA PANORAMICA DEL SITE



VISTA PARED PARIMETRICA

II .- SUMINISTRO DE ENERGIA AC:

Tipo de Instalacion:	Aérea
Nivel de Tensión:	LBT
Sistema de Conexión:	Monofásica
N° Suministro:	2020116903

PDP:	Estado:	OK
	Voltaje 1(VAC):	220
	ITM(A):	50
	TVSS	OK
	Corriente 1(AAC):	4.23



PDP

III .- SUMINISTRO DE ENERGIA DC:

Gabinete Rectificador:	Estado:	OK
	Marca:	HUAWEI
	Ventiladores:	OK
	A/A:	OK
	Filtros:	OK

Power Core:	Marca:	HUAWEI
	Modelo:	ETP-48200A1
	Controlador:	
	Modelo:	SMU02B
	Voltaje (VDC):	51
	Carga (ADC):	12
	LVBD/BLVD(VDC):	46
	LVLD/LLVD(VDC):	41
	Módulos:	Estado: OK
		Modelo1: R4850G
		Cantidad1: 2



Rectificador 1



Power Core 1

Bancada Total 1:	Estado:	OK
	Cantidad:	30
	Voltaje (V):	51
	Marca1:	HUAWEI
	Modelo1:	ESM-48150A1
	Capacidad1(Ah):	150
	Autonomia (Hr):	27

IV .- GABINETE DE TRANSMISION:

Gabinete Tx1:

Estado:

Ventiladores:

A/A:

Filtros:

Radios (#):

Routers (#):

Modem (#):

BBU (#):

Switch (#):

Media Converter (#):

OK

OK

OK

OK

1

1

0

1

0

0



Gabinete Tx 1 Abierto



Pasamuro Gabinete Tx 1

V .- BTS:

BBU:

Tipo:

Estado:

FAN:

Cable FO:

BB5900

OK

OK

Estado: OK

Banda 1 (MHz): 3500

Cantidad: 1


VSWR: OK

Alarmas Externas: OK

Alarmas Internas: OK




Panoramica de BBU1

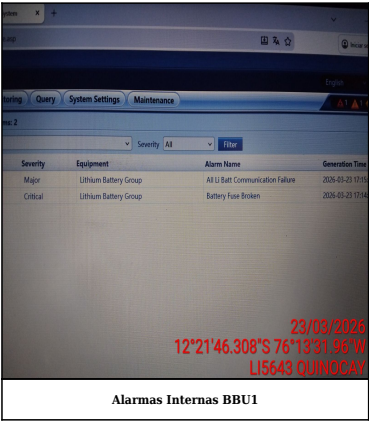


Alarmas Internas BBU1



Alarmas Externas

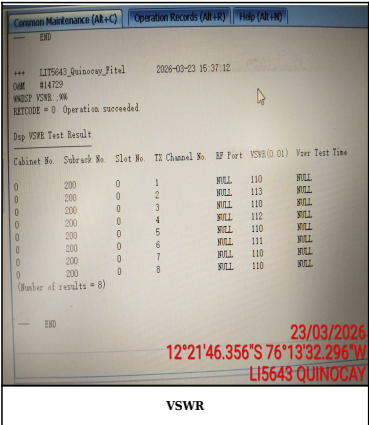

VSWR

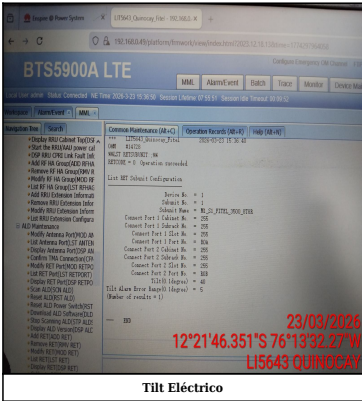

Tilt Eléctrico

VI .- SISTEMA RADIANTE:

Antenas:

Sectoriales TDD: Estado: OK
Cantidad: 1
Modelo: ATD
Tilt m.1(°): OK

Microondas: Estado: N/A
Cantidad: 0




Torre



Vulcanizado Conectores S1



Vulcanizado Conectores S2



Vulcanizado Conectores S3

RRU Cantidad: 1
Conectores: OK
Cables RF/IF: OK

Luz de Balizaje: Estado: N/A
Cantidad: 0

Pararrayos: Estado: OK

VII.- SISTEMA DE PUESTA A TIERRA:

Estado: OK
Tipo: malla
Cantidad: 3
Resistencia (Ω): 1.95
Topologia : horizontal



Resistencia de SPAT



Pozo a tierra

VIII.- IMAGENES FINALES:



Foto Panorámica del Interior del Site



Resistencia de SPAT



Pozo a tierra

IX.- OBSERVACIONES FINALES:

NA

N/A

Observacion 1
