

ZONA	COCHAMARCA	NOMBRE SITE:	COCHAMARCA	CODIGO SITE:	LI1559	FECHA :	2026-03-27 20:38:00
CRQ	CRQ000000045770	COORDENADAS	-10.86654,-77.12857	TÉCNICO RESPONSABLE	Madeleine Rodriguez		

I .- INFRAESTRUCTURA

Site:	Modelo:	GRINFIELD		
	Tipo:	AUTO SOPORTADA		
Torre:	Tipo:	arriestada		
	Estado:	OK		
	Altura (m):	25		
	Verticalidad:	OK		
	Pintura:	OK		
	Escalera:	OK		
	Línea de vida:	OK		
	Cable Vientos:	N/A		
	Grapas:	N/A		
	Templadores:	N/A		
	Base Templadores:	N/A		
	Base de Torre:	OK		
Paredes:	OK			
Concertina:	OK			
Puerta:	OK			
Chapa:	OK			

II .- SUMINISTRO DE ENERGIA AC:

Tipo de Instalacion:	Aérea	
Nivel de Tensión:	LMT	
Sistema de Conexión:	Monofásica	
N° Suministro:	Na	
PDP:	Estado: OK	
	Voltaje 1(VAC): 220	
	ITM(A): 50	
	TVSS OK	
	Corriente 1(AAC): 16	

III .- SUMINISTRO DE ENERGIA DC:

Gabinete Rectificador:	Estado: OK		
	Marca: HUAWEI		
	Ventiladores: OK		
	A/A: OK		
	Filtros: OK		
Power Core:	Marca: Huawei		
	Modelo: mts9000A		
	Controlador:		
	Modelo: SMU02B		
	Voltaje (VDC): 51		
	Carga (ADC): 15		
	LVBD/BLVD(VDC):56		
	LVLVD/LLVD(VDC): 56		
	Módulos:		
	Estado: OK		
	Modelo1: R4850		
	Cantidad1: 2		
Bancada Total 1:	Estado: OK		
	Cantidad: 3		
	Voltaje (V): 51		
	Marca1: HUAWEI		
	Modelo1: esm48150		
	Capacidad1(Ah): 150		
	Autonomia (Hr): 18		


IV .- GABINETE DE TRANSMISION:

Gabinete Tx1:

Estado:	OK
Ventiladores:	OK
A/A:	OK
Filtros:	OK
Radios (#):	1
Routers (#):	1
Modem (#):	0
BBU (#):	1
Switch (#):	0
Media Converter (#):	0



Gabinete Tx 1 Abierto

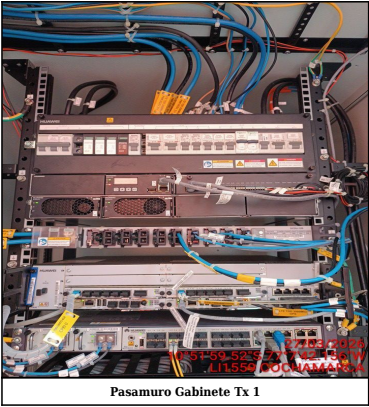


Pasamuro Gabinete Tx 1


V .- BTS:

BBU:

Tipo:	BB3500
Estado:	OK
FAN:	OK
Cable FO:	Estado: OK
	Banda 1 (MHz): 3500
	Cantidad: 4
	VSWR: OK
	Alarmas Externas: OK
	Alarmas Internas: OK

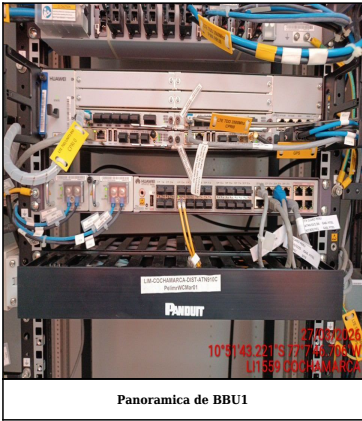


Panoramica de BBU1

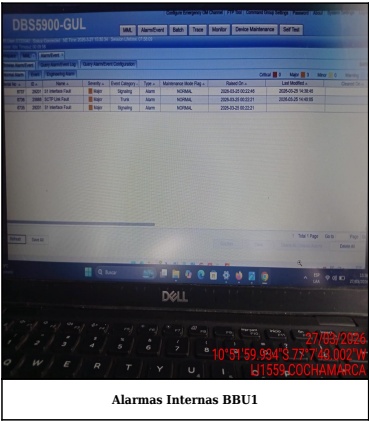


Alarmas Internas BBU1



Alarmas Externas

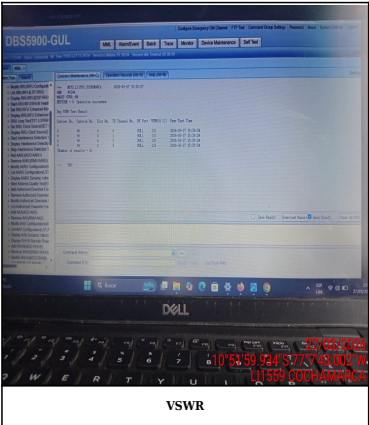

VSWR

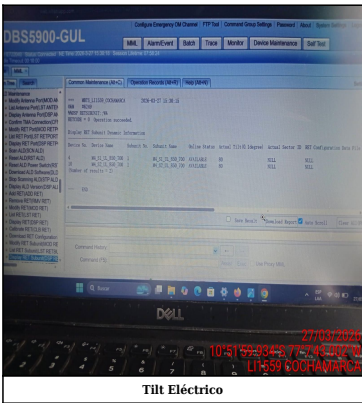

Tilt Eléctrico

VI .- SISTEMA RADIANTE:

Antenas:

Sectoriales TDD:	Estado:	OK
	Cantidad:	2
	Modelo:	NA
	Tilt m.1(°):	OK

Microondas:	Estado:	OK
	Cantidad:	2



Torre



Vulcanizado Conectores S1


RRU	Cantidad:	2
	Conectores:	OK
	Cables RF/IF:	OK

Luz de Balizaje:	Estado:	OK
	Cantidad:	1

Pararrayos:	Estado:	OK
-------------	---------	----



Vulcanizado Conectores S2



Vulcanizado Conectores S3

VII.- SISTEMA DE PUESTA A TIERRA:

Estado:	OK
Tipo:	unico
Cantidad:	3
Resistencia (Ω)	3
Topologia :	mallá



Resistencia de SPAT



Pozo a tierra

VIII.- IMAGENES FINALES:



Foto Panorámica del Interior del Site



Resistencia de SPAT



Pozo a tierra

IX.- OBSERVACIONES FINALES:

na

N/A

Observacion 1
