

ZONA	PACARAOS	NOMBRE SITE:	VISCAS	CODIGO SITE:	LI5145	FECHA :	2026-03-28 01:06:51
CRQ	CRQ000000041128	COORDENADAS		TÉCNICO RESPONSABLE	Jesus Espinoza		

I .- INFRAESTRUCTURA

Site:	Modelo:	greenfield			
	Tipo:	indoor			
Torre:	Tipo:	Autosportada triangular			
	Estado:	OK			
	Altura (m):	25			
	Verticalidad:	OK			
	Pintura:	OK			
	Escalera:	OK			
	Línea de vida:	OK			
	Cable Vientos:	N/A			
	Grapas:	N/A			
	Templadores:	N/A			
	Base Templadores:	N/A			
	Base de Torre:	OK			
Paredes:	OK				
Concertina:	OK				
Puerta:	OK				
Chapa:	OK				



VISTA PANORAMICA DEL SITE



VISTA PARED PARIMETRICA

II .- SUMINISTRO DE ENERGIA AC:

Tipo de Instalacion:	Súbterranea				
Nivel de Tensión:	LBT				
Sistema de Conexión:	Monofásica				
N° Suministro:	NV				
PDP:	Estado:	OK			
	Voltaje 1(VAC):	221			
	ITM(A):	50			
	TVSS	OK			
	Corriente 1(AAC):	13			



PDP

III .- SUMINISTRO DE ENERGIA DC:

Gabinete Rectificador:	Estado:	OK			
	Marca:	Huawei			
	Ventiladores:	OK			
	A/A:	OK			
	Filtros:	OK			
Power Core:	Marca:	Huawei			
	Modelo:	Huawei			
	Controlador:				
	Modelo:	SMU02B			
	Voltaje (VDC):	51			
	Carga (ADC):	23.4			
	LVBD/BLVD(VDC):	45			
	LVLD/LLVD(VDC):	47			
	Módulos:	Estado:	OK		
		Modelo1:	R4850G		
		Cantidad1:	2		
Bancada Total 1:	Estado:	OK			
	Cantidad:	3			
	Voltaje (V):	51			
	Marca1:	Huawei			
	Modelo1:	ESM-48150A1			
	Capacidad1(Ah):	450			
	Autonomía (Hr):	17.5			



Rectificador 1



Power Core 1

IV .- GABINETE DE TRANSMISION:

Gabinete Tx1:

Estado:

Ventiladores:

A/A:

Filtros:

Radios (#):

Routers (#):

Modem (#):

BBU (#):

Switch (#):

Media Converter (#):

OK

OK

OK

OK

1

1

1

1

1

1



Gabinete Tx 1 Abierto



Pasamuro Gabinete Tx 1

V .- BTS:

BBU:

Tipo:

Estado:

FAN:

Cable FO:

5900

OK

OK

Estado: OK

Banda 1 (MHz): 3500

Cantidad: 1

VSWR:


Alarmas Externas:

Alarmas Internas:


OK

OK

OK

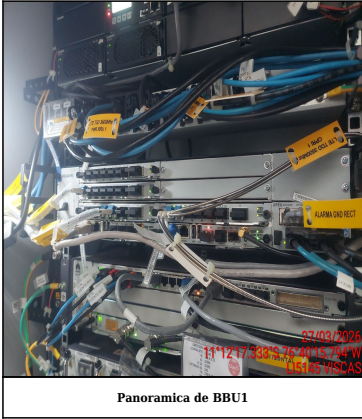


Panoramica de BBU1

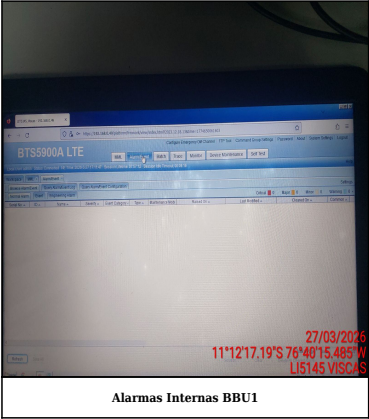


Alarmas Internas BBU1



Alarmas Externas

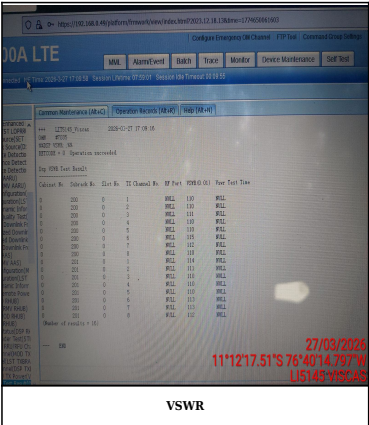

VSWR

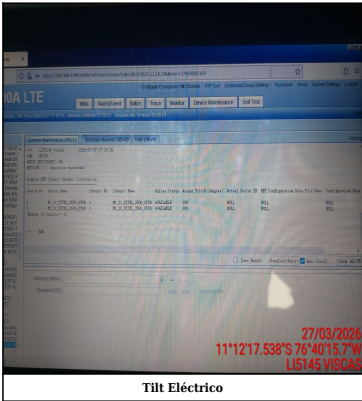

Tilt Eléctrico

VI .- SISTEMA RADIANTE:

Antenas:

Sectoriales TDD:	Estado:	OK
	Cantidad:	2
	Modelo:	NA
	Tilt m.1(°):	OK

Microondas:	Estado:	OK
	Cantidad:	2



Torre



Vulcanizado Conectores S1

RRU	Cantidad:	2
	Conectores:	OK
	Cables RF/IF:	OK

Luz de Balizaje:	Estado:	OK
	Cantidad:	1

Pararrayos:	Estado:	OK
-------------	---------	----



Vulcanizado Conectores S2



Vulcanizado Conectores S3

VII.- SISTEMA DE PUESTA A TIERRA:

Estado:	OK
Tipo:	único
Cantidad:	3
Resistencia (Ω)	3.32
Topología :	parres



Resistencia de SPAT



Pozo a tierra

VIII.- IMAGENES FINALES:



Foto Panorámica del Interior del Site



Resistencia de SPAT



Pozo a tierra

IX.- OBSERVACIONES FINALES:

NA

N/A

Observacion 1
