

I .- INFRAESTRUCTURA

Site:	Modelo:	greenfield
	Tipo:	indoor
Torre:	Tipo:	autosoportada triangular
	Estado:	OK
	Altura (m):	25
	Verticalidad:	OK
	Pintura:	OK
	Escalera:	OK
	Línea de vida:	OK
	Cable Vientos:	N/A
	Grapas:	N/A
	Templadores:	N/A
	Base Templadores:	N/A
	Base de Torre:	OK
Paredes:	OK	
Concertina:	OK	
Puerta:	OK	
Chapa:	OK	



VISTA PANORAMICA DEL SITE



VISTA PARED PARIMETRICA

II .- SUMINISTRO DE ENERGIA AC:


Tipo de Instalacion:	Aérea	
Nivel de Tensión:	LMT	
Sistema de Conexión:	Monofásica	
N° Suministro:	NV	
PDP:	Estado:	OK
	Voltaje 1(VAC):	226.7
	ITM(A):	50
	TVSS	OK
	Corriente 1(AAC):	12



PDP

III .- SUMINISTRO DE ENERGIA DC:

Gabinete Rectificador:	Estado:	OK		
	Marca:	Huawei		
	Ventiladores:	OK		
	A/A:	OK		
	Filtros:	OK		
Power Core:	Marca:	Huawei		
	Modelo:	MTS9000A		
	Controlador:			
		Modelo:	SMU02B	
		Voltaje (VDC):	51	
		Carga (ADC):	18	
		LVBD/BLVD(VDC):	45	
		LVLD/LLVD(VDC):	47	
		Módulos:	Estado:	OK
			Modelo1:	R4850G
		Cantidad1:	2	
Bancada Total 1:	Estado:	OK		
	Cantidad:	2		
	Voltaje (V):	51		
	Marca1:	Huawei		
	Modelo1:	ESM-48150A1		
	Capacidad1(Ah):	300		
	Autonomia (Hr):	17.6		

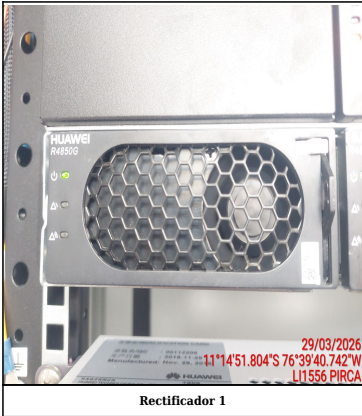

Rectificador 1




Power Core 1

IV .- GABINETE DE TRANSMISION:

Gabinete Tx1:

Estado:	OK
Ventiladores:	OK
A/A:	OK
Filtros:	OK
Radios (#):	1
Routers (#):	1
Modem (#):	1
BBU (#):	1
Switch (#):	1
Media Converter (#):	1

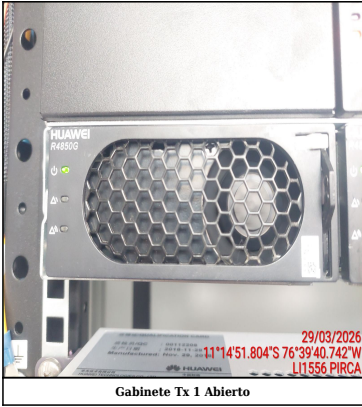

Gabinete Tx 1 Abierto




Pasamuro Gabinete Tx 1


V .- BTS:

BBU:

Tipo:	5900
Estado:	OK
FAN:	OK
Cable FO:	Estado: OK
	Banda 1 (MHz): 3500
	Cantidad: 1
VSWR: OK	
Alarmas Externas: OK	
Alarmas Internas: OK	

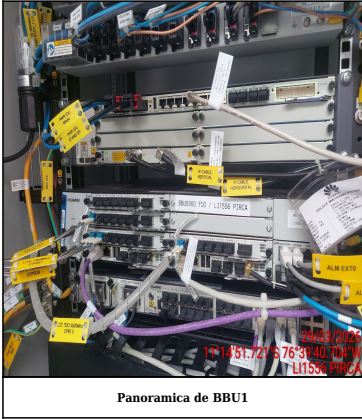


Panoramica de BBU1

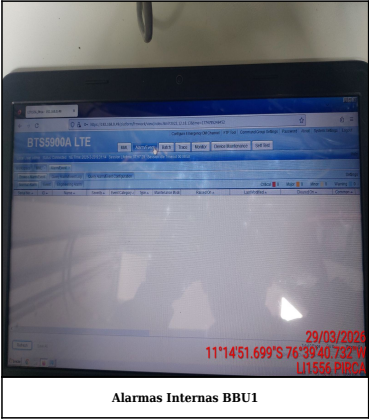


Alarmas Internas BBU1



Alarmas Externas

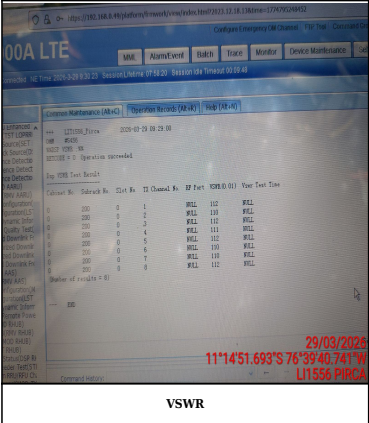

VSWR

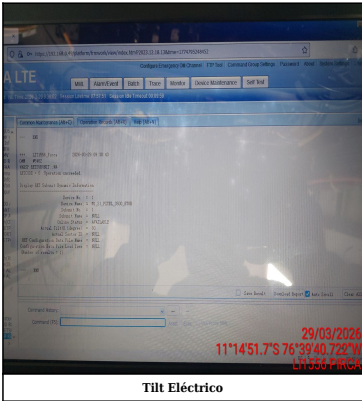

Tilt Eléctrico

VI .- SISTEMA RADIANTE:

Antenas:

Sectoriales TDD:	Estado:	OK
	Cantidad:	2
	Modelo:	NV
	Tilt m.1(°):	OK

Microondas:	Estado:	OK
	Cantidad:	1



Torre



Vulcanizado Conectores S1


RRU	Cantidad:	1
	Conectores:	OK
	Cables RF/IF:	OK

Luz de Balizaje:	Estado:	N/A
	Cantidad:	0

Pararrayos:	Estado:	OK
-------------	---------	----



Vulcanizado Conectores S2

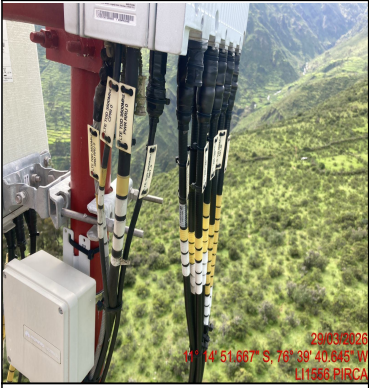

Vulcanizado Conectores S3

VII.- SISTEMA DE PUESTA A TIERRA:

Estado:	OK
Tipo:	único
Cantidad:	4
Resistencia (Ω)	3.51
Topología :	parres



Resistencia de SPAT



Pozo a tierra

VIII.- IMAGENES FINALES:



Foto Panorámica del Interior del Site



Resistencia de SPAT



Pozo a tierra

IX.- OBSERVACIONES FINALES:

NA

N/A

Observacion 1
