

ZONA	VEGUETA	NOMBRE SITE:	AMIRALLA	CODIGO SITE:	LI5730	FECHA :	2026-04-19 22:56:22
CRQ	CRQ000000055026	COORDENADAS		TÉCNICO RESPONSABLE	Jesus Espinoza		


I .- INFRAESTRUCTURA

Site:	Modelo:	greenfield		
	Tipo:	indoor		
Torre:	Tipo:	AUTOSOPORTADA		
	Estado:	OK		
	Altura (m):	20		
	Verticalidad:	OK		
	Pintura:	OK		
	Escalera:	OK		
	Línea de vida:	OK		
	Cable Vientos:	N/A		
	Grapas:	N/A		
	Templadores:	N/A		
	Base Templadores:	N/A		
	Base de Torre:	OK		
Paredes:	OK			
Concertina:	OK			
Puerta:	OK			
Chapa:	OK			

II .- SUMINISTRO DE ENERGIA AC:

Tipo de Instalacion:	Aérea		
Nivel de Tensión:	LBT		
Sistema de Conexión:	Monofásica		
N° Suministro:	nv		
PDP:	Estado:		OK
	Voltaje 1(VAC):		220
	ITM(A):		50
	TVSS		OK
	Corriente 1(AAC):		12

III .- SUMINISTRO DE ENERGIA DC:

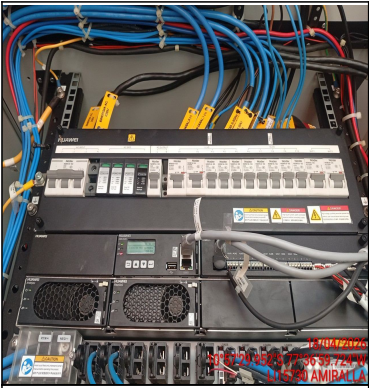
Gabinete Rectificador:	Estado:	OK		
	Marca:	hualwei		
	Ventiladores:	OK		
	A/A:	OK		
	Filtros:	OK		
Power Core:	Marca:	Huawei		
	Modelo:	MTS9000A		
	Controlador:	Modelo: SMU02B		
		Voltaje (VDC): 51		
		Carga (ADC): 12		
		LVBD/BLVD(VDC):45		
		LVLD/LLVD(VDC): 47		
	Módulos:	Estado: OK		
		Modelo1: R4850G		
		Cantidad1: 2		
Bancada Total 1:	Estado:	OK		
	Cantidad:	3		
	Voltaje (V):	51		
	Marca1:	Huawei		
	Modelo1:	ESM48150A1		
	Capacidad1(Ah):	150		
	Autonomia (Hr):	18		

IV .- GABINETE DE TRANSMISION:

Gabinete Tx1:	Estado:	OK
	Ventiladores:	OK
	A/A:	OK
	Filtros:	OK
	Radios (#):	1
	Routers (#):	1
	Modem (#):	1
	BBU (#):	1
	Switch (#):	1
	Media Converter (#):	1



Gabinete Tx 1 Abierto

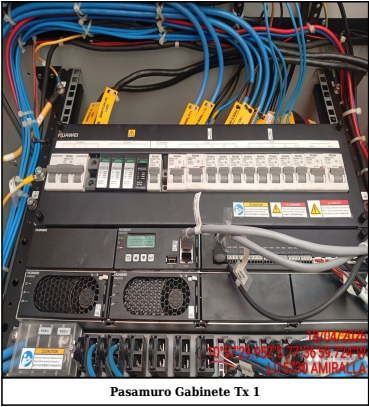


Pasamuro Gabinete Tx 1

V .- BTS:

BBU:	Tipo:	5900
	Estado:	OK
	FAN:	OK
	Cable FO:	Estado: OK
		Banda 1 (MHz): 3500
		Cantidad: 1
	VSWR:	OK
	Alarmas Externas:	OK
	Alarmas Internas:	OK




Panoramica de BBU1

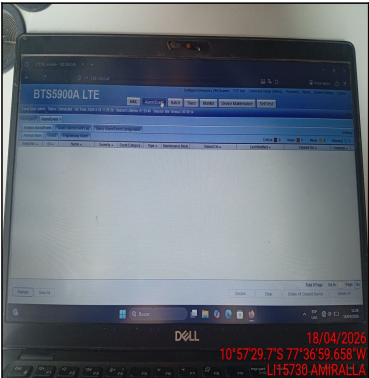


Alarmas Internas BBU1



Alarmas Externas

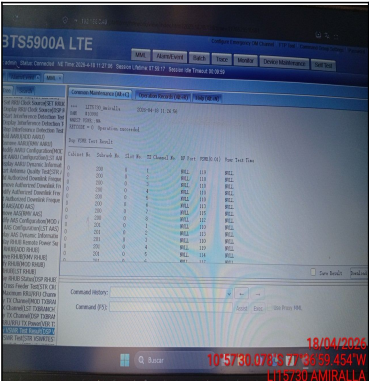

VSWR

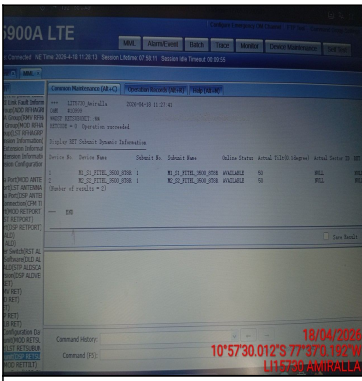

Tilt Eléctrico

VI .- SISTEMA RADIANTE:

Antenas:

Sectoriales TDD: Estado: OK
Cantidad: 2
Modelo: nv
Tilt m.1(°): OK

Microondas: Estado: OK
Cantidad: 1

RRU Cantidad: 1
Conectores: OK
Cables RF/IF: OK

Luz de Balizaje: Estado: OK
Cantidad: 1

Pararrayos: Estado: OK



Torre



Vulcanizado Conectores S1



Vulcanizado Conectores S2



Vulcanizado Conectores S3

VII.- SISTEMA DE PUESTA A TIERRA:

Estado: OK
Tipo: unico
Cantidad: 3
Resistencia (Ω) 3.14
Topologia : único



Resistencia de SPAT



Pozo a tierra

VIII.- IMAGENES FINALES:



Foto Panorámica del Interior del Site



Resistencia de SPAT



Pozo a tierra

IX.- OBSERVACIONES FINALES:

n.a

N/A

Observacion 1
