



REPORTE FOTOGRÁFICO - Localidad del Acta de Conformidad

Nombre de la Estacion: SANTA CRUZ DE ANDAMARCA
Nombre de Localidad: SANTA CRUZ DE ANDAMARCA
Fecha: 29/04/2026 - 29/04/2026
Direccion: Centro Poblado SANTA CRUZ DE ANDAMARCA
ID site: 1506100001
CRQ: CRQ000000060758

FOTO 1

Referencia Localidad (Letrero,Otro)

FOTO 2

Referencia Local (Municipalidad, Otro)

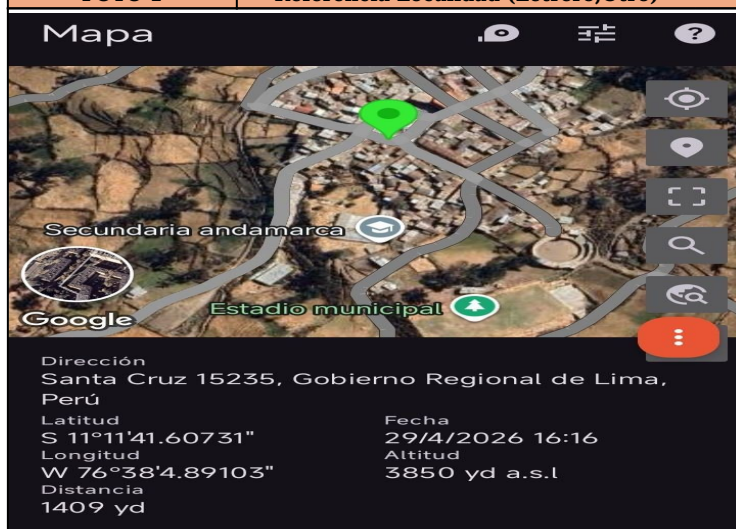


FOTO 3

Persona Local que firma el Acta

FOTO 4

Foto tomada del NOC



FOTO 5

Foto del Acta firmada

FOTO 6

Foto del Acta dentro del Gabinete

FORMATO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PROGRAMADO	
Fecha de realización:	29-04-2026
Nombre de la localidad:	SANTA CRUZ DE ANDAMARCA
ID:	1506100001
Nombre de autoridad localidad:	JOSE LUIS FLORES
Nombre responsable de mantenimiento:	PAOLO ALIAS SANCHEZ
Energía AC-DC-AA	Estado: N/A
Línea Eléctrica	Verificar el estado de transformadores.
Volante AC	Verificar que los valores de voltaje estén en el rango.
Rectificadores	Verificar el buen funcionamiento de los rectificadores.
Notas de baterías	Probar el buen estado de las baterías.
Tableros de Distribución	Verificar el estado de los tableros de Distribución.
Aire Acondicionado	Verificar el buen funcionamiento del aire acondicionado.
Interruptores termomagnéticos	Verificar el buen estado de los interruptores.
Conectores eléctricos	Verificar el buen estado de los conductores eléctricos.
Conectores y terminales	Observar el buen estado de los conectores y terminales.
Luminarias	Probar todas las luminarias del site.
Luz de Rutaje	Verificar el buen funcionamiento.
SWAT	Verificar el estado de los pozos, tanto de caja como cables.
Sistema de Puente a Tierra	Verificar que todos los equipos tengan conexión a los polos a tierra.
Almacenamiento Equipos	Verificar que todos los equipos tengan conexión a los polos a tierra.
Mantenimiento en Gabinetes	Estado: N/A
Equipos RRU, Router o M2V	Verificar el buen estado de equipos.
Tarjetas electrónicas	Verificar el buen estado de las tarjetas electrónicas.
Cables	Verificar la limpieza eléctrica y el orden de los cables.
Aterramiento	Verificación y ajuste de aterramiento.
Sistema Radiante	Estado: N/A
Conectores	Verificar estado de conectores RRU y ODU.
Cables	Verificar estado de cables de las RRU y ODU.
Antenas	Verificar conectores y estado de antenas y kits de anclaje.
VSWR cables	Medir el VSWR mediante software adecuado.
Seguridad Físico Interior	Estado: N/A
Chapa Eléctrica	Verificar correcto funcionamiento.
Tarjetas	Verificar el buen funcionamiento de la lectora.
Cámara	Revisión de sujeción y anclajes de la Cámara.
Grabador de Video	Verificar grabación local.
Sensor de Humo	Revisión estado del sensor de Humo.
Obras civiles - Seguridad Exterior	Estado: N/A
Estado de Puertas y paredes	Verificar el estado de puertas, paredes y cerraduras.
Concertina	Verificar el estado de la Concertina.
Filtración de agua	Inspeccionar el correcto sellado de los gabinetes.
Estado de Monopolo/Torre	N/A
Autoprotección/Torre Ventada	Inspeccionar el estado de estructuras.
Cable de vida	Inspeccionar el buen estado del cable de vida.
Limpieza general de site	N/A

Nombre: JOSE LUIS FLORES
Cargo: PDI NOC
29/04/2026
11°11'41.352"S 76°38'5.004"W
1506100001 SANTA CRUZ DE ANDAMARCA

N/A
