

09/06/2026

10°44'17.449"S 77°36'51.494"W

LI3921 VIRGEN DEL ROSARIO

VISTA PANORAMICA DEL SITE

09/06/2026

10°44'17.422"S 77°36'41.494"W

LI3921 VIRGEN DEL ROSARIO

VISTA PARED PERIMETRICA

II .- SUMINISTRO DE ENERGIA AC:

Tipo de Instalacion:

Súbtterranea

Nivel de Tensión:

LBT

Sistema de Conexión:

Monofásica

N° Suministro:

0

PDP:

Estado:

Voltaje 1(VAC):

ITM(A):

TVSS

Corriente 1(AAC):

OK

50

220

OK

17.2

09/06/2026

10°44'17.505"S 77°36'51.414"W

LI3921 VIRGEN DEL ROSARIO

PDP

III .- SUMINISTRO DE ENERGIA DC:

Gabinete Rectificador:

Estado:

Marca:

Ventiladores:

A/A:

Filtros:

OK

Huawei

OK

OK

OK

Power Core:

Marca:

Modelo:

Controlador:

Huawei

MTS9000A

Modelo:

Voltaje (VDC):

Carga (ADC):

LVBD/BLVD(VDC):

LVLVD/LLVD(VDC):

SMU02B

51

17

43

47

Módulos:

Estado:

Modelo1:

Cantidad1:

OK

R4850G

2

Bancada Total 1:

Estado:

Cantidad:

Voltaje (V):

Marca1:

Modelo1:

Capacidad1(Ah):

Autonomía (Hr):

OK

0

51

otros

ESM48150G

150

19

09/06/2026

10°44'17.449"S 77°36'51.494"W

LI3921 VIRGEN DEL ROSARIO

Rectificador 1

09/06/2026

10°44'17.422"S 77°36'41.494"W


LI3921 VIRGEN DEL ROSARIO

Power Core 1


IV .- GABINETE DE TRANSMISION:

Gabinete Tx1:

Estado:	OK
Ventiladores:	OK
A/A:	OK
Filtros:	OK
Radios (#):	1
Routers (#):	0
Modem (#):	1
BBU (#):	0
Switch (#):	0
Media Converter (#):	0

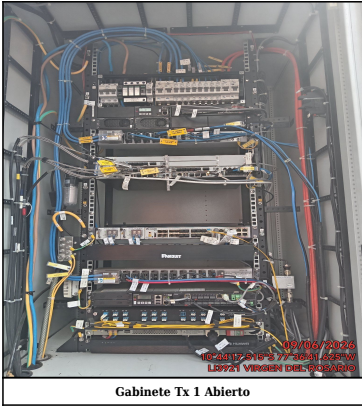

Gabinete Tx 1 Abierto

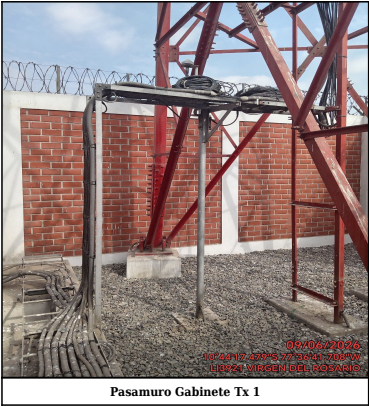

Pasamuro Gabinete Tx 1


V .- BTS:

BBU:


Tipo:	TDD
Estado:	OK
FAN:	OK
Cable FO:	Estado: OK
	Banda 1 (MHz): 3500
	Cantidad: 1
	VSWR: OK
	Alarmas Externas: OK
	Alarmas Internas: OK




Panoramica de BBU1



Alarmas Internas BBU1

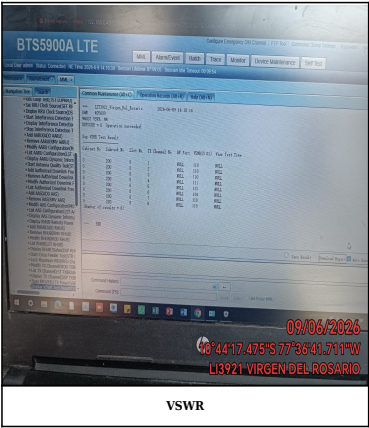

VSWR

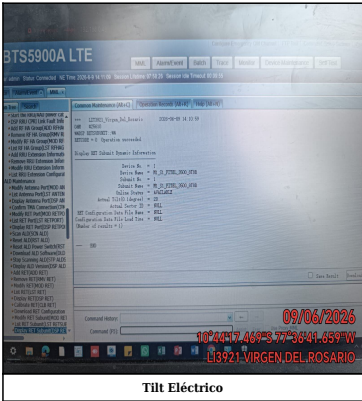

Tilt Eléctrico

VI .- SISTEMA RADIANTE:

Antenas:

Sectoriales TDD:	Estado:	OK
	Cantidad:	1
	Modelo:	n.v
	Tilt m.1(°):	N/A

Microondas:	Estado:	OK
	Cantidad:	1



Torre



Vulcanizado Conectores S1

RRU	Cantidad:	1
	Conectores:	OK
	Cables RF/IF:	OK

Luz de Balizaje:	Estado:	OK
	Cantidad:	1

Pararrayos:	Estado:	OK
-------------	---------	----



Vulcanizado Conectores S2



Vulcanizado Conectores S3

VII.- SISTEMA DE PUESTA A TIERRA:

Estado:	OK
Tipo:	parres
Cantidad:	1
Resistencia (Ω)	1.23
Topologia :	malla



Resistencia de SPAT



Pozo a tierra

VIII.- IMAGENES FINALES:



Foto Panorámica del Interior del Site



Resistencia de SPAT



Pozo a tierra

IX.- OBSERVACIONES FINALES:

n.a

N/A

Observacion 1
