

ZONA	TUPE	NOMBRE SITE:	TUPE	CODIGO SITE:	LI1546	FECHA :	2026-06-10 17:33:24
CRQ	CRQ000000081455	COORDENADAS	12°	TÉCNICO RESPONSABLE	Alcides Guevara		

I .- INFRAESTRUCTURA

Site:	Modelo:	GREENFIELD					
	Tipo:	OUTDOOR					
Torre:	Tipo:	AUTOSOPORTA					
	Estado:	OK					
	Altura (m):	35					
	Verticalidad:	OK					
	Pintura:	OK					
	Escalera:	OK					
	Línea de vida:	OK					
	Cable Vientos:	N/A					
	Grapas:	N/A					
	Templadores:	N/A					
	Base Templadores:	N/A					
	Base de Torre:	OK					
Paredes:	OK						
Concertina:	OK						
Puerta:	OK						
Chapa:	OK						



VISTA PANORAMICA DEL SITE



VISTA PARED PARIMETRICA

II .- SUMINISTRO DE ENERGIA AC:

Tipo de Instalacion:	Aérea						
Nivel de Tensión:	LBT						
Sistema de Conexión:	Monofásica						
N° Suministro:	12087						
PDP:	Estado:	OK					
	Voltaje 1(VAC):	217					
	ITM(A):	50					
	TVSS	OK					
	Corriente 1(AAC):	5.7					



PDP

III .- SUMINISTRO DE ENERGIA DC:

Gabinete Rectificador:	Estado:	OK					
	Marca:	Huawei					
	Ventiladores:	OK					
	A/A:	OK					
	Filtros:	OK					
Power Core:	Marca:	Huawei					
	Modelo:	ETP48200A					
	Controlador:	Modelo:	SMU02B				
		Voltaje (VDC):	51				
		Carga (ADC):	9.8				
		LVBD/BLVD(VDC):	41				
		LVLVD/LLVD(VDC):	46				
	Módulos:	Estado:	OK				
		Modelo1:	R4850G				
		Cantidad1:	2				
Bancada Total 1:	Estado:	OK					
	Cantidad:	3					
	Voltaje (V):	51					
	Marca1:	HUAWEI					
	Modelo1:	ESM-48150A1					
	Capacidad1(Ah):	150					
	Autonomia (Hr):	28					



Rectificador 1



Power Core 1

IV .- GABINETE DE TRANSMISION:

Gabinete Tx1:

Estado: OK

Ventiladores: OK

A/A: OK

Filtros: OK

Radios (#): 0

Routers (#): 1

Modem (#): 0

BBU (#): 1

Switch (#): 0

Media Converter (#): 0



Gabinete Tx 1 Abierto



Pasamuro Gabinete Tx 1

V .- BTS:

BBU:

Tipo: BBU5900

Estado: OK

FAN: OK

Cable FO: Estado: OK

Banda 1 (MHz): 3500

Cantidad: 1


VSWR: OK

Alarmas Externas: OK


Alarmas Internas: OK




Panoramica de BBU1

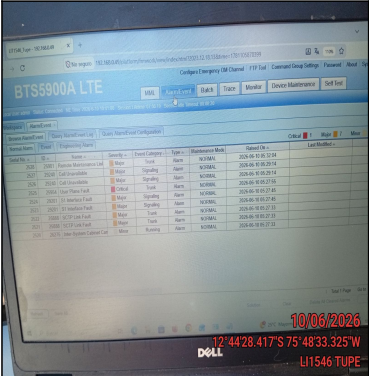


Alarmas Internas BBU1

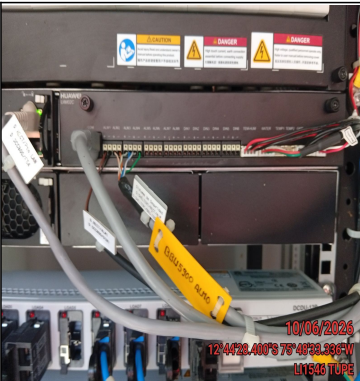

Alarmas Externas

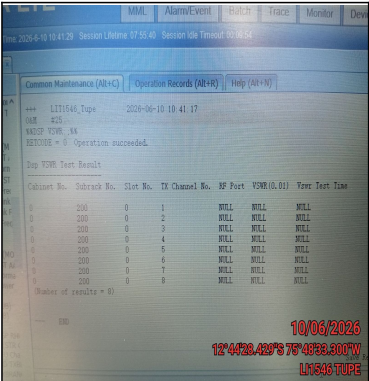

VSWR

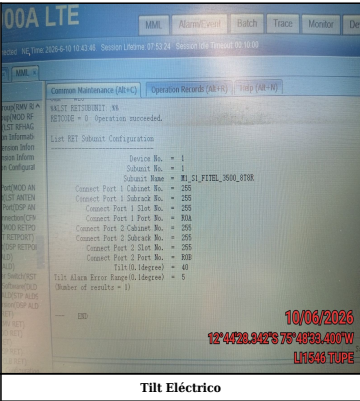

Tilt Eléctrico

VI .- SISTEMA RADIANTE:

Antenas:

Sectoriales TDD:

Estado:
Cantidad:
Modelo:
Tilt m.1(*):

OK
1
ATD
OK

Microondas:

Estado:
Cantidad:

N/A
0



Torre



Vulcanizado Conectores S1

RRU

Cantidad:
Conectores:
Cables RF/IF:

1
OK
OK

Luz de Balizaje:

Estado:
Cantidad:

OK
1


Pararrayos:

Estado:

OK



Vulcanizado Conectores S2



Vulcanizado Conectores S3

VII.- SISTEMA DE PUESTA A TIERRA:

Estado:

Tipo:

Cantidad:

Resistencia (Ω):

Topologia :

OK
malla
2
3.87
Horizontal



Resistencia de SPAT



Pozo a tierra

VIII.- IMAGENES FINALES:



Foto Panorámica del Interior del Site



Resistencia de SPAT



Pozo a tierra

IX.- OBSERVACIONES FINALES:

NA

N/A

Observacion 1
