

ZONA	PACCHO	NOMBRE SITE:	PACCHO	CODIGO SITE:	LI5354	FECHA :	2026-06-16 16:18:09
CRQ	CRQ000000084934	COORDENADAS		TÉCNICO RESPONSABLE	Jesus Espinoza		

I .- INFRAESTRUCTURA

Site:	Modelo:	greenfield		
	Tipo:	indoor		
Torre:	Tipo:	AUTOSOPORTADA		
	Estado:	OK		
	Altura (m):	20		
	Verticalidad:	OK		
	Pintura:	OK		
	Escalera:	OK		
	Línea de vida:	OK		
	Cable Vientos:	N/A		
	Grapas:	N/A		
	Templadores:	N/A		
	Base Templadores:	N/A		
	Base de Torre:	OK		
Paredes:	OK			
Concertina:	OK			
Puerta:	OK			
Chapa:	OK			

VISTA PANORAMICA DEL SITE


VISTA PARED PARIMETRICA

II .- SUMINISTRO DE ENERGIA AC:

Tipo de Instalacion:	Aérea	
Nivel de Tensión:	LBT	
Sistema de Conexión:	Monofásica	
N° Suministro:	nv	
PDP:	Estado: OK	
	Voltaje 1(VAC): 220	
	ITM(A): 50	
	TVSS OK	
	Corriente 1(AAC): 5	

PDP

III .- SUMINISTRO DE ENERGIA DC:

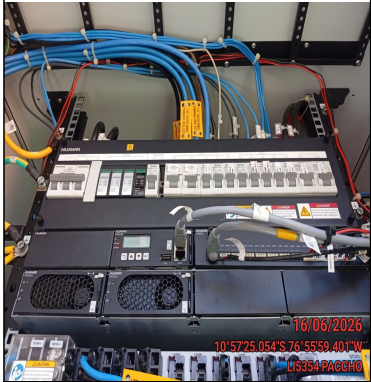Gabinete Rectificador:	Estado: OK		
	Marca: Huawei		
	Ventiladores: OK		
	A/A: OK		
	Filtros: OK		
Power Core:	Marca: Huawei		
	Modelo: MTS900A		
	Controlador:		
	Modelo: SMU02B		
	Voltaje (VDC): 52		
	Carga (ADC): 14		
	LVBD/BLVD(VDC):45		
	LVLDD/LLVD(VDC): 47		
	Módulos:	Estado: OK	
	Modelo1: R4850G		
	Cantidad1: 2		
Bancada Total 1:	Estado: OK		
	Cantidad: 3		
	Voltaje (V): 52		
	Marca1: Huawei		
	Modelo1: ESM48150A1		
	Capacidad1(Ah): 450		
	Autonomia (Hr): 18		

Rectificador 1


Power Core 1

IV .- GABINETE DE TRANSMISION:

Gabinete Tx1: Estado: OK
Ventiladores: OK
A/A: OK
Filtros: OK
Radios (#): 1
Routers (#): 0
Modem (#): 0
BBU (#): 1
Switch (#): 1
Media Converter (#): 1



Gabinete Tx 1 Abierto

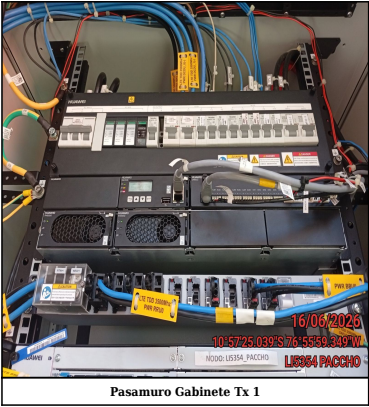

Pasamuro Gabinete Tx 1


V .- BTS:

BBU: Tipo: 5900
Estado: OK
FAN: OK
Cable FO: Estado: OK
Banda 1 (MHz): 3500
Cantidad: 1

VSWR: OK
Alarmas Externas: OK
Alarmas Internas: OK




Panoramica de BBU1

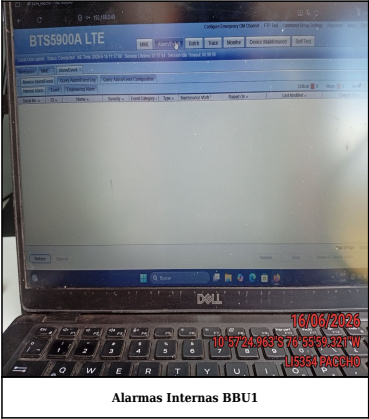


Alarmas Internas BBU1



Alarmas Externas

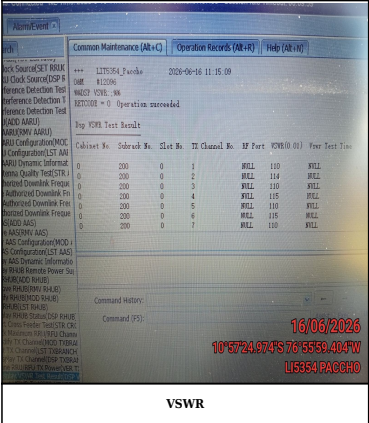

VSWR

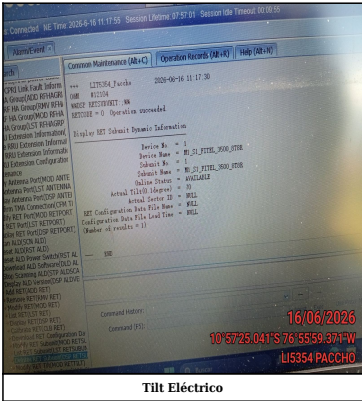

Tilt Eléctrico

VI .- SISTEMA RADIANTE:

Antenas:

Sectoriales TDD:	Estado:	OK
	Cantidad:	1
	Modelo:	nv
	Tilt m.1(°):	OK

Microondas:	Estado:	N/A
	Cantidad:	0

RRU	Cantidad:	1
	Conectores:	OK
	Cables RF/IF:	OK

Luz de Balizaje:	Estado:	N/A
	Cantidad:	0

Pararrayos:	Estado:	OK
-------------	---------	----



Torre



Vulcanizado Conectores S1



Vulcanizado Conectores S2



Vulcanizado Conectores S3

VII.- SISTEMA DE PUESTA A TIERRA:

Estado:	OK
Tipo:	unico
Cantidad:	1
Resistencia (Ω)	2.34
Topologia :	único



Resistencia de SPAT



Pozo a tierra

VIII.- IMAGENES FINALES:



Foto Panorámica del Interior del Site



Resistencia de SPAT



Pozo a tierra

IX.- OBSERVACIONES FINALES:

n.a

N/A

Observacion 1
