

ZONA	HUAMANTANGA	NOMBRE SITE:	MARCO	CODIGO SITE:	LI4239	FECHA :	2026-06-19 14:40:44
CRQ	CRQ000000085379	COORDENADAS		TÉCNICO RESPONSABLE	Milton Diaz		

I .- INFRAESTRUCTURA

Site:	Modelo:	GREENFIELD		
	Tipo:	OUTDOOR		
Torre:	Tipo:	AUTOSOPORTADA TRIANGULAR		
	Estado:	OK		
	Altura (m):	25		
	Verticalidad:	OK		
	Pintura:	OK		
	Escalera:	OK		
	Línea de vida:	OK		
	Cable Vientos:	N/A		
	Grapas:	N/A		
	Templadores:	N/A		
	Base Templadores:	N/A		
	Base de Torre:	OK		
Paredes:	OK			
Concertina:	OK			
Puerta:	OK			
Chapa:	OK			

II .- SUMINISTRO DE ENERGIA AC:

Tipo de Instalacion:	Súbterranea		
Nivel de Tensión:	LMT		
Sistema de Conexión:	Monofásica		
N° Suministro:	0		
PDP:	Estado:		OK
	Voltaje 1(VAC):		223
	ITM(A):		50
	TVSS		N/A
	Corriente 1(AAC):		0

III .- SUMINISTRO DE ENERGIA DC:

Gabinete Rectificador:	Estado:	OK		
	Marca:	HUAWEI		
	Ventiladores:	OK		
	A/A:	OK		
	Filtros:	OK		
Power Core:	Marca:	HUAWEI		
	Modelo:	HUAWEI		
	Controlador:			
	Modelo:	SMU02B		
	Voltaje (VDC):	51		
	Carga (ADC):	16		
	LVBD/BLVD(VDC):	43		
	LVLD/LLVD(VDC):	46		
	Módulos:	Estado:	OK	
		Modelo1:	R4850G	
		Cantidad1:	2	
Bancada Total 1:	Estado:	OK		
	Cantidad:	3		
	Voltaje (V):	51		
	Marca1:	HUAWEI		
	Modelo1:	ESM-48150A1		
	Capacidad1(Ah):	150		
	Autonomia (Hr):	18.7		

IV .- GABINETE DE TRANSMISION:

Gabinete Tx1:

Estado:	OK
Ventiladores:	OK
A/A:	OK
Filtros:	OK
Radios (#):	1
Routers (#):	1
Modem (#):	0
BBU (#):	1
Switch (#):	0
Media Converter (#):	0



Gabinete Tx 1 Abierto



Pasamuro Gabinete Tx 1

V.- BTS:

BBU:

Tipo:	TDD
Estado:	OK
FAN:	OK
Cable FO:	Estado: OK
	Banda 1 (MHz): 3.5
	Cantidad: 1

VSWR: OK
Alarmas Externas: OK
Alarmas Internas: OK




Panorámica de BBU1




Alarmas Internas BBU1



Alarmas Externas

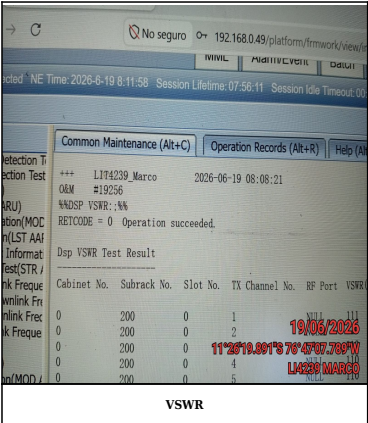

VSWR

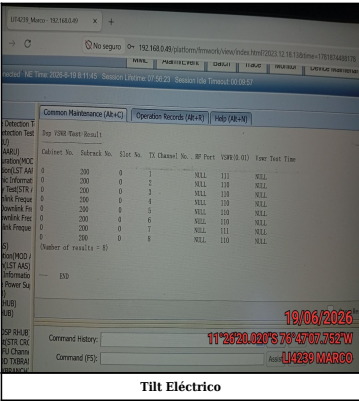

Tilt Eléctrico

VI.- SISTEMA RADIANTE:

Antenas:

Sectoriales TDD: Estado: OK
Cantidad: 1
Modelo: ATD4516R8
Tilt m.1(°): OK

Microondas: Estado: OK
Cantidad: 1



Torre



Vulcanizado Conectores S1

RRU Cantidad: 1
Conectores: OK
Cables RF/IF: OK

Luz de Balizaje: Estado: N/A
Cantidad: 0

Pararrayos: Estado: OK



Vulcanizado Conectores S2



Vulcanizado Conectores S3

VII.- SISTEMA DE PUESTA A TIERRA:

Estado: OK
Tipo: PARRES
Cantidad: 3
Resistencia (Ω): 1.08
Topologia : MALLA



Resistencia de SPAT



Pozo a tierra

VIII.- IMAGENES FINALES:



Foto Panorámica del Interior del Site



Resistencia de SPAT



Pozo a tierra

IX.- OBSERVACIONES FINALES:

paredes con descascaracion



Observacion 1
