

ZONA	CHANCAY	NOMBRE SITE:	PAMPA LIBRE FITEL 2019	CODIGO SITE:	LI5103	FECHA :	2026-06-22 18:01:07
------	---------	--------------	------------------------	--------------	--------	---------	---------------------


CRQ	CRQ000000087839	COORDENADAS	TÉCNICO RESPONSABLE	Luz Ferrer
-----	-----------------	-------------	---------------------	------------

I .- INFRAESTRUCTURA

Site:	Modelo:	GREENFIELD
	Tipo:	OUTDOOR
Torre:	Tipo:	AUTOSOPORTADA
	Estado:	OK
	Altura (m):	35
	Verticalidad:	OK
	Pintura:	OK
	Escalera:	OK
	Línea de vida:	OK
	Cable Vientos:	N/A
	Grapas:	N/A
	Templadores:	N/A
	Base Templadores:	N/A
	Base de Torre:	OK
Paredes:	OK	
Concertina:	OK	
Puerta:	OK	
Chapa:	OK	



VISTA PANORAMICA DEL SITE

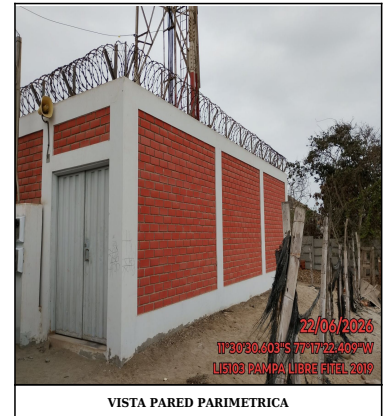


VISTA PARED PARIMETRICA

II .- SUMINISTRO DE ENERGIA AC:

Tipo de Instalacion:	Aérea
Nivel de Tensión:	LBT
Sistema de Conexión:	Monofásica
N° Suministro:	nv

PDP:	Estado:	OK
	Voltaje 1(VAC):	0
	ITM(A):	50
	TVSS	OK
	Corriente 1(AAC):	0

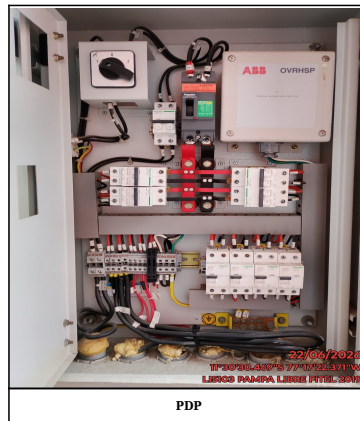


PDP

III .- SUMINISTRO DE ENERGIA DC:

Gabinete Rectificador:	Estado:	OK		
	Marca:	huawei		
	Ventiladores:	OK		
	A/A:	OK		
	Filtros:	OK		
Power Core:	Marca:	huawei		
	Modelo:	huawei		
	Controlador:			
		Modelo:	smu02b	
		Voltaje (VDC):	51	
		Carga (ADC):	20	
		LVBD/BLVD(VDC):	43	
		LVLD/LLVD(VDC):	46	
		Módulos:	Estado:	OK
		Modelo1:	r4850g	
		Cantidad1:	2	
Bancada Total 1:	Estado:	OK		
	Cantidad:	0		
	Voltaje (V):	51		
	Marca1:	huawei		
	Modelo1:	esm-48150a1		
	Capacidad1(Ah):	150		
	Autonomia (Hr):	4		



Rectificador 1

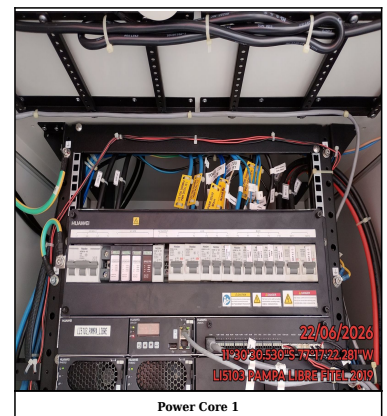

Power Core 1



IV .- GABINETE DE TRANSMISION:

Gabinete Tx1:	Estado:	OK
	Ventiladores:	OK
	A/A:	OK
	Filtros:	OK
	Radio (#):	1
	Router (#):	1
	Modem (#):	0
	BBU (#):	1
	Switch (#):	0
	Media Converter (#):	1



V .- BTS:

BBU:	Tipo:	5900
	Estado:	OK
	FAN:	OK
	Cable FO:	Estado: OK
		Banda 1 (MHz): 0
		Cantidad: 0
	VSWR:	OK
	Alarmas Externas:	OK
	Alarmas Internas:	OK

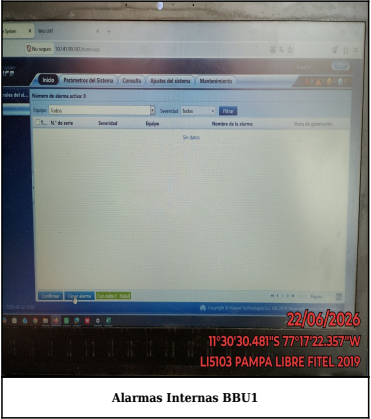

VI .- SISTEMA RADIANTE:

Antenas:

Sectoriales TDD:	Estado:	OK
	Cantidad:	3
	Modelo:	NV
	Tilt m.1(°):	OK

Microondas:	Estado:	OK
	Cantidad:	1



Torre



Vulcanizado Conectores S1

RRU	Cantidad:	4
	Conectores:	OK
	Cables RF/IF:	OK

Luz de Balizaje:	Estado:	OK
	Cantidad:	1

Pararrayos:	Estado:	OK
-------------	---------	----



Vulcanizado Conectores S2



Vulcanizado Conectores S3

VII.- SISTEMA DE PUESTA A TIERRA:

Estado:	OK
Tipo:	parres
Cantidad:	4
Resistencia (Ω)	3.68
Topologia :	mallá



Resistencia de SPAT



Pozo a tierra

VIII.- IMAGENES FINALES:



Foto Panorámica del Interior del Site



Resistencia de SPAT



Pozo a tierra

IX.- OBSERVACIONES FINALES:

na

N/A

Observacion 1
