

ZONA	LARAOS	NOMBRE SITE:	LARAOS	CODIGO SITE:	LI1194	FECHA :	2026-06-23 18:26:45
CRQ	CRQ000000088903	COORDENADAS	12°	TÉCNICO RESPONSABLE	Alcides Guevara		

I .- INFRAESTRUCTURA

Site:	Modelo:	GREENFIELD		
	Tipo:	INDOOR		
Torre:	Tipo:	VENTADA		
	Estado:	OK		
	Altura (m):	25		
	Verticalidad:	OK		
	Pintura:	OK		
	Escalera:	OK		
	Línea de vida:	OK		
	Cable Vientos:	OK		
	Grapas:	OK		
	Templadores:	OK		
	Base Templadores:	OK		
	Base de Torre:	OK		
Paredes:	OK			
Concertina:	OK			
Puerta:	OK			
Chapa:	OK			

II .- SUMINISTRO DE ENERGIA AC:

Tipo de Instalacion:	Aérea			
Nivel de Tensión:	LBT			
Sistema de Conexión:	Monofásica			
N° Suministro:	NA			
PDP:	Estado:	OK		
	Voltaje 1(VAC):	227		
	ITM(A):	50		
	TVSS	OK		
	Corriente 1(AAC):	4.56		

III .- SUMINISTRO DE ENERGIA DC:

Gabinete Rectificador:	Estado:	OK		
	Marca:	HUAWEI		
	Ventiladores:	OK		
	A/A:	OK		
	Filtros:	OK		
Power Core:	Marca:	HUAWEI		
	Modelo:	ETP48200		
	Controlador:	Modelo: SMU02B		
		Voltaje (VDC): 51		
		Carga (ADC): 19.8		
		LVBD/BLVD(VDC):41		
		LVLD/LLVD(VDC): 46		
	Módulos:	Estado: OK		
		Modelo1: R4850G		
		Cantidad1: 2		
Bancada Total 1:	Estado:	OK		
	Cantidad:	40		
	Voltaje (V):	51		
	Marca1:	HUAWEI		
	Modelo1:	ESM-48150A1		
	Capacidad1(Ah):	150		
	Autonomia (Hr):	32		

IV .- GABINETE DE TRANSMISION:

Gabinete Tx1:	Estado:	OK
	Ventiladores:	OK
	A/A:	OK
	Filtros:	OK
	Radio (#):	0
	Router (#):	1
	Modem (#):	0
	BBU (#):	1
	Switch (#):	0
	Media Converter (#):	0




Gabinete Tx 1 Abierto




Pasamuro Gabinete Tx 1

V .- BTS:

BBU:	Tipo:	BBU5900
	Estado:	OK
	FAN:	OK
	Cable FO:	Estado: OK
		Banda 1 (MHz): 3500
		Cantidad: 2
	VSWR:	OK
	Alarmas Externas:	OK
	Alarmas Internas:	OK

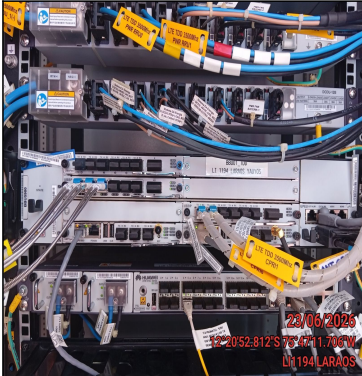


Panoramica de BBU1

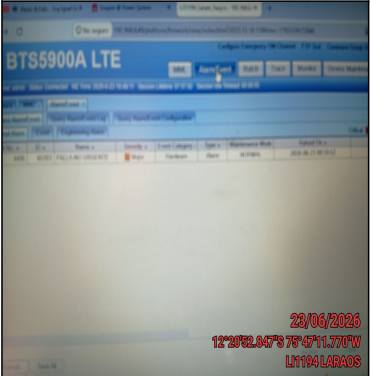


Alarmas Internas BBU1



Alarmas Externas

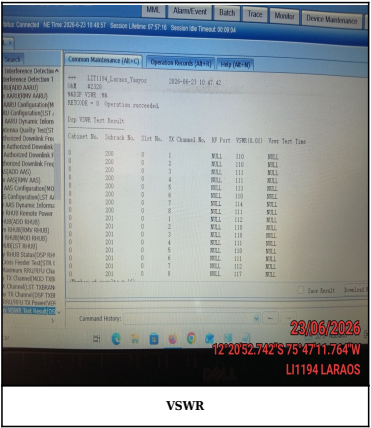

VSWR

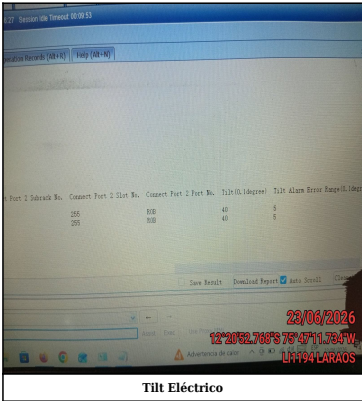

Tilt Eléctrico

VI .- SISTEMA RADIANTE:

Antenas:

Sectoriales TDD:	Estado:	OK
	Cantidad:	2
	Modelo:	ATD
	Tilt m.1(°):	OK

Microondas:	Estado:	N/A
	Cantidad:	0

RRU	Cantidad:	2
	Conectores:	OK
	Cables RF/IF:	OK

Luz de Balizaje:	Estado:	OK
	Cantidad:	1

Pararrayos:	Estado:	OK
-------------	---------	----




Torre



Vulcanizado Conectores S1



Vulcanizado Conectores S2



Vulcanizado Conectores S3

VII.- SISTEMA DE PUESTA A TIERRA:

Estado:	OK
Tipo:	MALLA
Cantidad:	4
Resistencia (Ω)	3.57
Topologia :	HORIZONTAL



Resistencia de SPAT



Pozo a tierra

VIII.- IMAGENES FINALES:



Foto Panorámica del Interior del Site



Resistencia de SPAT



Pozo a tierra

IX.- OBSERVACIONES FINALES:

NA

N/A

Observacion 1
