

I .- INFRAESTRUCTURA

Site:	Modelo:	GREENFIELD
	Tipo:	OUTDOOR
Torre:	Tipo:	AUTOSOPORTADA TRIANGULAR
	Estado:	OK
	Altura (m):	25
	Verticalidad:	OK
	Pintura:	OK
	Escalera:	OK
	Línea de vida:	OK
	Cable Vientos:	N/A
	Grapas:	N/A
	Templadores:	N/A
	Base Templadores:	N/A
	Base de Torre:	OK
Paredes:	OK	
Concertina:	OK	
Puerta:	OK	
Chapa:	OK	



VISTA PANORAMICA DEL SITE



VISTA PARED PARIMETRICA

II .- SUMINISTRO DE ENERGIA AC:

Tipo de Instalacion:	Aérea
Nivel de Tensión:	LMT
Sistema de Conexión:	Monofásica
N° Suministro:	0

PDP:	Estado:	OK
	Voltaje 1(VAC):	224
	ITM(A):	50
	TVSS	N/A
	Corriente 1(AAC):	0




PDP

III .- SUMINISTRO DE ENERGIA DC:

Gabinete Rectificador:	Estado:	OK
	Marca:	HUAWEI
	Ventiladores:	OK
	A/A:	OK
	Filtros:	OK
Power Core:	Marca:	HUAWEI
	Modelo:	HUAWEI
	Controlador:	
	Modelo:	SMU02B
	Voltaje (VDC):	51
	Carga (ADC):	16.8
	LVBD/BLVD(VDC):	43
	LVLD/LLVD(VDC):	46
	Módulos:	Estado: OK
		Modelo1: R4850G
		Cantidad1: 2
Bancada Total 1:	Estado:	OK
	Cantidad:	2
	Voltaje (V):	51
	Marca1:	HUAWEI
	Modelo1:	ESM-48150A1
	Capacidad1(Ah):	150
	Autonomia (Hr):	17.9



Rectificador 1

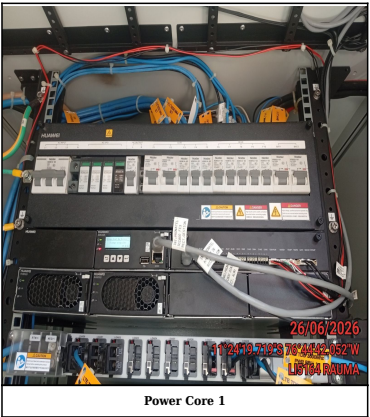

Power Core 1

IV .- GABINETE DE TRANSMISION:

Gabinete Tx1:

Estado:

Ventiladores:

A/A:

Filtros:

Radios (#):

Routers (#):

Modem (#):

BBU (#):

Switch (#):

Media Converter (#):

OK

OK

OK

OK

1

1

0

1

0

0



Gabinete Tx 1 Abierto



Pasamuro Gabinete Tx 1

V.- BTS:

BBU:

Tipo:

Estado:

FAN:

Cable FO:

TDD

OK

OK

Estado:

Banda 1 (MHz):

Cantidad:

OK

3.5

1

VSWR:

Alarmas Externas:

Alarmas Internas:

OK

OK

OK




Panoramica de BBU1




Alarmas Internas BBU1



Alarmas Externas

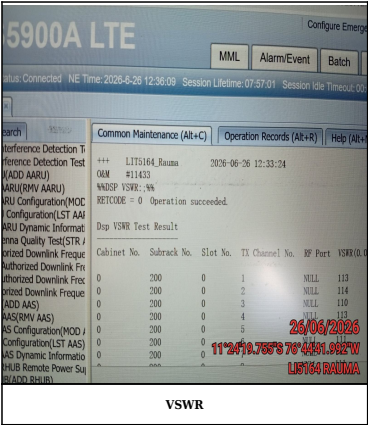

VSWR

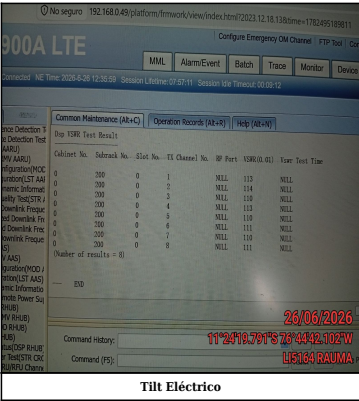


Tilt Eléctrico

VI.- SISTEMA RADIANTE:

Antenas:

Sectoriales TDD:	Estado:	OK
	Cantidad:	1
	Modelo:	ATD4516R8
	Tilt m.1(°):	OK

Microondas:	Estado:	OK
	Cantidad:	1

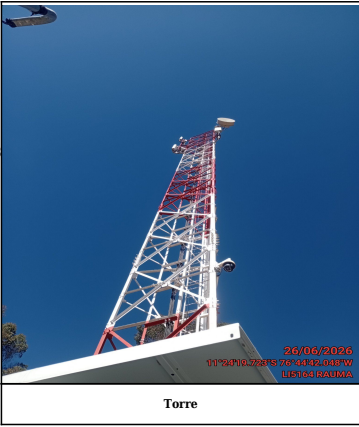

Torre



Vulcanizado Conectores S1


RRU	Cantidad:	1
	Conectores:	OK
	Cables RF/IF:	OK

Luz de Balizaje:	Estado:	N/A
	Cantidad:	0

Pararrayos:	Estado:	OK
-------------	---------	----



Vulcanizado Conectores S2



Vulcanizado Conectores S3

VII.- SISTEMA DE PUESTA A TIERRA:

Estado:	OK
Tipo:	PARRES
Cantidad:	1
Resistencia (Ω):	1.32
Topología :	MALLA



Resistencia de SPAT



Pozo a tierra

VIII.- IMAGENES FINALES:



Foto Panorámica del Interior del Site



Resistencia de SPAT



Pozo a tierra

IX.- OBSERVACIONES FINALES:

paredes con descascaracion



Observacion 1
