

ZONA	TANTA	NOMBRE SITE:	TANTA	CODIGO SITE:	LI1557	FECHA :	2026-07-08 21:38:30
CRQ	CRQ000000095486	COORDENADAS	12°	TÉCNICO RESPONSABLE	Alcides Guevara		

I .- INFRAESTRUCTURA

Site: Modelo: GREENFIELD Tipo: INDOOR Torre: Tipo: AUTOSOPORTA Estado: OK Altura (m): 25 Verticalidad: OK Pintura: OK Escalera: OK Línea de vida: OK Cable Vientos: N/A Grapas: N/A Templadores: N/A Base Templadores: N/A Base de Torre: OK Paredes: OK Concertina: OK Puerta: OK Chapa: OK	 VISTA PANORAMICA DEL SITE	 VISTA PARED PARIMETRICA
--	--	---

II .- SUMINISTRO DE ENERGIA AC:

Tipo de Instalacion: Aérea Nivel de Tensión: LMT Sistema de Conexión: Monofásica N° Suministro: NA PDP: Estado: OK Voltaje 1(VAC): 226 ITM(A): 50 TVSS: OK Corriente 1(AAC): 4.8	 PDP	
--	---	--

III .- SUMINISTRO DE ENERGIA DC:


Gabinete Rectificador: Estado: OK Marca: HUAWEI Ventiladores: OK A/A: OK Filtros: OK Power Core: Marca: HUAWEI Modelo: ETO48200A1 Controlador: Modelo: SMU02B Voltaje (VDC): 51 Carga (ADC): 18.4 LVBD/BLVD(VDC): 41 LVLD/LLVD(VDC): 46 Módulos: Estado: OK Modelo1: R4850G Cantidad1: 2 Bancada Total 1: Estado: OK Cantidad: 4 Voltaje (V): 51 Marca1: HUAWEI Modelo1: ESM-48150A1 Capacidad1(Ah): 150 Autonomia (Hr): 32	 Rectificador 1	 Power Core 1
--	---	--

IV .- GABINETE DE TRANSMISION:

Gabinete Tx1:	Estado:	OK
	Ventiladores:	OK
	A/A:	OK
	Filtros:	OK
	Radios (#):	0
	Routers (#):	1
	Modem (#):	0
	BBU (#):	1
	Switch (#):	0
	Media Converter (#):	0



Gabinete Tx 1 Abierto

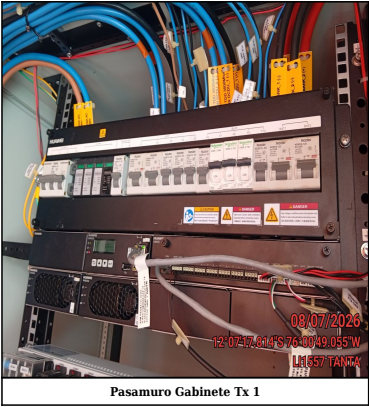


Pasamuro Gabinete Tx 1

V .- BTS:

BBU:	Tipo:	BBU5900
	Estado:	OK
	FAN:	OK
	Cable FO:	Estado: OK
		Banda 1 (MHz): 3500
		Cantidad: 2
	VSWR:	OK
	Alarmas Externas:	OK
	Alarmas Internas:	OK




Panoramica de BBU1

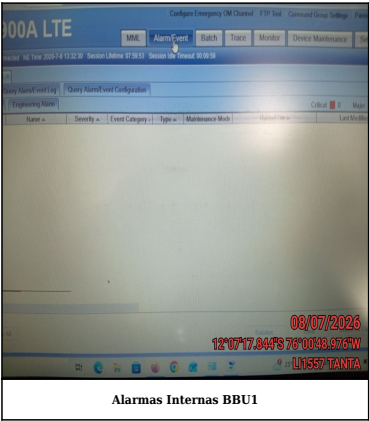


Alarmas Internas BBU1



Alarmas Externas

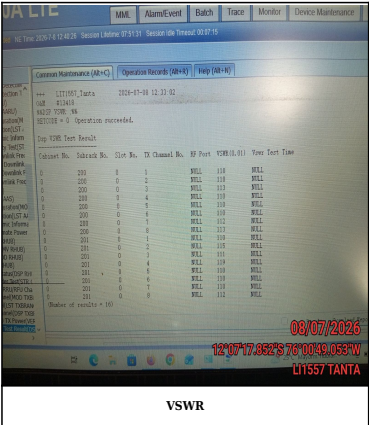

VSWS

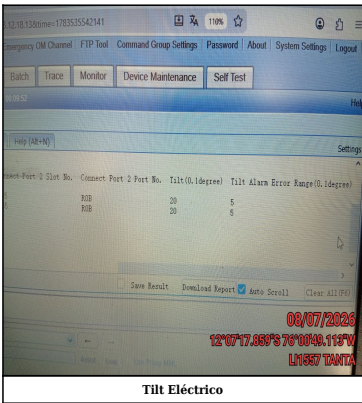

Tilt Eléctrico

VI .- SISTEMA RADIANTE:

Antenas:

Sectoriales TDD: Estado: OK
Cantidad: 2
Modelo: ATD
Tilt m.1(*): OK

Microondas: Estado: N/A
Cantidad: 0



Torre



Vulcanizado Conectores S1



Vulcanizado Conectores S2



Vulcanizado Conectores S3

RRU Cantidad: 2
Conectores: OK
Cables RF/IF: OK

Luz de Balizaje: Estado: OK
Cantidad: 1

Pararrayos: Estado: OK

VII.- SISTEMA DE PUESTA A TIERRA:

Estado: OK
Tipo: malla
Cantidad: 2
Resistencia (Ω): 2.33
Topología : horizontal



Resistencia de SPAT



Pozo a tierra

VIII.- IMAGENES FINALES:



Foto Panorámica del Interior del Site



Resistencia de SPAT



Pozo a tierra

IX.- OBSERVACIONES FINALES:

NA

N/A

Observacion 1
