

14/07/2026

12°13'14.129°S 76°30'17.059°W

LI1544 LOS OLLEROS

VISTA PANORAMICA DEL SITE

14/07/2026

12°13'14.158°S 76°30'17.018°W

LI1544 LOS OLLEROS

VISTA PARED PARIMETRICA

II .- SUMINISTRO DE ENERGIA AC:

Tipo de Instalacion:

Nivel de Tensión:

Sistema de Conexión:

N° Suministro:

Aérea

LBT

Monofásica

No visible

PDP:

Estado:

Voltaje 1(VAC):

ITM(A):

TVSS

Corriente 1(AAC):

OK

219

50

N/A

12

14/07/2026

12°13'14.158°S 76°30'17.018°W

LI1544 LOS OLLEROS

PDP

III .- SUMINISTRO DE ENERGIA DC:

Gabinete Rectificador:

Estado:

Marca:

Ventiladores:

A/A:

Filtros:

OK

Huawei

OK

OK

OK

Power Core:

Marca:

Modelo:

Controlador:

Huawei

MTS9000A

Modelo:

Voltaje (VDC):

Carga (ADC):

LVBD/BLVD(VDC):

LVLVD/LLVD(VDC):

Huawei

51

18.8

43

47

Módulos:

Estado:

Modelo1:

Cantidad1:

OK

R4850G

3

Bancada Total 1:

Estado:

Cantidad:

Voltaje (V):

Marca1:

Modelo1:

Capacidad1(Ah):

Autonomía (Hr):

OK

2

49

Huawei

ESM-1+48150A

150

25.6

14/07/2026

12°13'14.514°S 76°30'17.061°W

LI1544 LOS OLLEROS

Rectificador 1

14/07/2026

12°13'14.225°S 76°30'17.057°W

LI1544 LOS OLLEROS

Power Core 1


IV .- GABINETE DE TRANSMISION:

Gabinete Tx1:

Estado:	OK
Ventiladores:	OK
A/A:	OK
Filtros:	OK
Radios (#):	1
Routers (#):	0
Modem (#):	0
BBU (#):	1
Switch (#):	0
Media Converter (#):	0



Gabinete Tx 1 Abierto

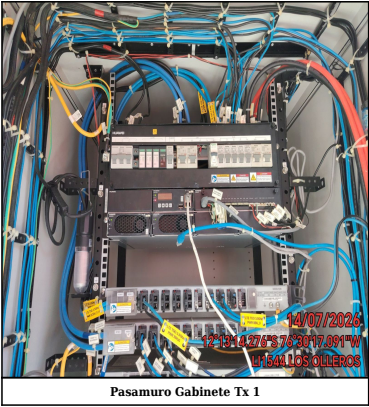


Pasamuro Gabinete Tx 1

V .- BTS:


BBU:

Tipo:	5900
Estado:	OK
FAN:	OK
Cable FO:	Estado: OK
	Banda 1 (MHz): 3500
	Cantidad: 1

VSWR:	OK
Alarmas Externas:	OK
Alarmas Internas:	OK

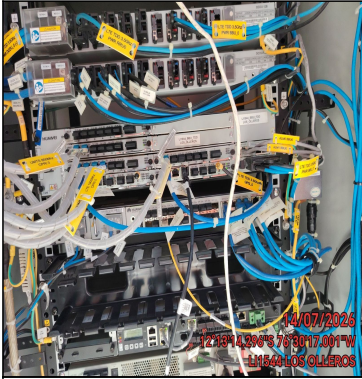


Panoramica de BBU1




Alarmas Internas BBU1



Alarmas Externas

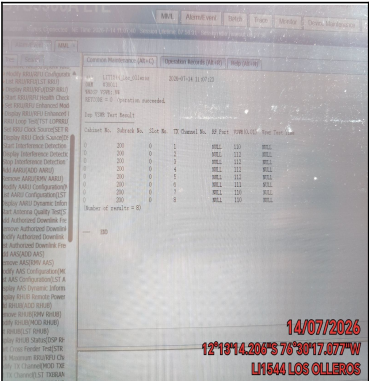

VSWR

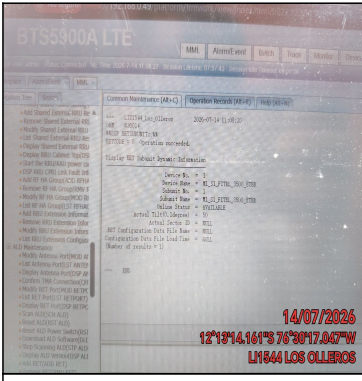

Tilt Eléctrico

VI .- SISTEMA RADIANTE:

Antenas:

Sectoriales TDD:	Estado:	OK
	Cantidad:	1
	Modelo:	No visible
	Tilt m.1(°):	OK

Microondas:	Estado:	OK
	Cantidad:	1



Torre



Vulcanizado Conectores S1

RRU	Cantidad:	1
	Conectores:	OK
	Cables RF/IF:	OK

Luz de Balizaje:	Estado:	OK
	Cantidad:	1

Pararrayos:	Estado:	OK
-------------	---------	----



Vulcanizado Conectores S2



Vulcanizado Conectores S3

VII.- SISTEMA DE PUESTA A TIERRA:

Estado:	OK
Tipo:	Parre
Cantidad:	1
Resistencia (Ω)	1.63
Topologia :	Malla



Resistencia de SPAT



Pozo a tierra


VIII.- IMAGENES FINALES:



Foto Panorámica del Interior del Site



Resistencia de SPAT

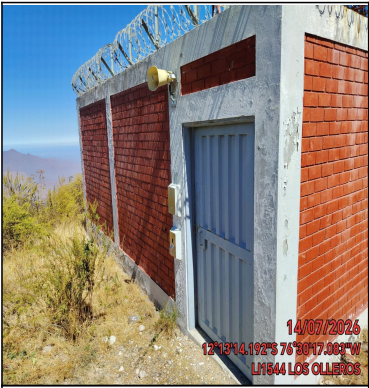

Pozo a tierra

IX.- OBSERVACIONES FINALES:

Ok0

N/A

Observacion 1
