

15/07/2026

11°43'56.319"S 76°58'22.387"W

LI4488 EL OLIVAR

VISTA PANORAMICA DEL SITE

15/07/2026

11°43'56.269"S 76°58'22.506"W

LI4488 EL OLIVAR

VISTA PARED PARIMETRICA

II .- SUMINISTRO DE ENERGIA AC:

Tipo de Instalacion:

Nivel de Tensión:

Sistema de Conexión:

N° Suministro:

Aérea

LBT

Monofásica

No visible

PDP:

Estado:

Voltaje 1(VAC):

ITM(A):

TVSS

Corriente 1(AAC):

OK

224

50

OK

12

15/07/2026

11°43'56.319"S 76°58'22.387"W

LI4488 EL OLIVAR

PDP

III .- SUMINISTRO DE ENERGIA DC:

Gabinete Rectificador:

Estado:

Marca:

Ventiladores:

A/A:

Filtros:

OK

Huawei

OK

OK

OK

Power Core:

Marca:

Modelo:

Controlador:

Huawei

MTS9000A

Modelo:

Voltaje (VDC):

Carga (ADC):

LVBD/BLVD(VDC):

LVLVD/LLVD(VDC):

Huawei

51

18.2

43

47

Módulos:

Estado:

Modelo1:

Cantidad1:

OK

R4850G

2

Bancada Total 1:

Estado:

Cantidad:

Voltaje (V):

Marca1:

Modelo1:

Capacidad1(Ah):

Autonomía (Hr):

OK

3

48.3

Huawei

ESM-48150A1

150

24.7

15/07/2026

11°43'56.564"S 76°58'22.346"W

LI4488 EL OLIVAR

Rectificador 1

15/07/2026

11°43'56.319"S 76°58'22.387"W

LI4488 EL OLIVAR


Power Core 1

IV .- GABINETE DE TRANSMISION:

Gabinete Tx1: Estado: OK
Ventiladores: OK
A/A: OK
Filtros: OK
Radios (#): 1
Routers (#): 0
Modem (#): 0
BBU (#): 1
Switch (#): 0
Media Converter (#): 0



Gabinete Tx 1 Abierto

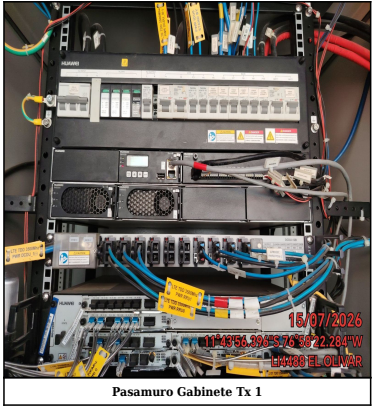


Pasamuro Gabinete Tx 1


V .- BTS:

BBU: Tipo: 5900
Estado: OK
FAN: OK
Cable FO: Estado: N/A
Banda 1 (MHz): 3500
Cantidad: 1

VSWR: OK
Alarmas Externas: OK
Alarmas Internas: OK

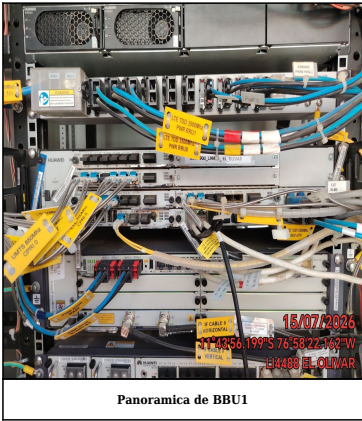


Panoramica de BBU1

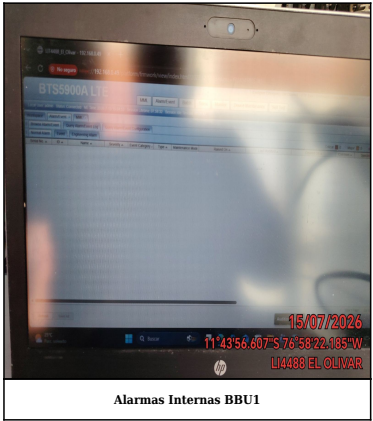


Alarmas Internas BBU1



Alarmas Externas

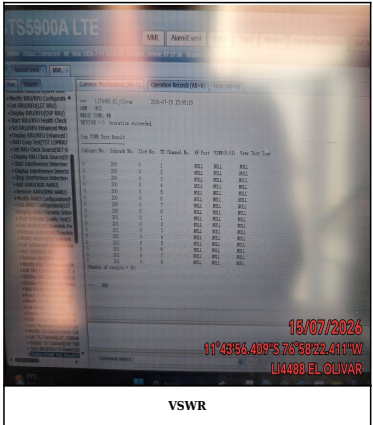

VSWR

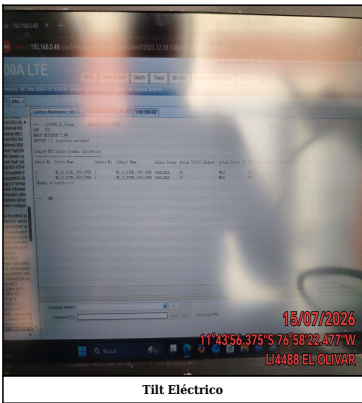

Tilt Eléctrico

VI .- SISTEMA RADIANTE:

Antenas:

Sectoriales TDD:	Estado:	N/A
	Cantidad:	0
	Modelo:	Na
	Tilt m.1(°):	OK

Microondas:	Estado:	N/A
	Cantidad:	0



Torre



Vulcanizado Conectores S1

RRU	Cantidad:	2
	Conectores:	OK
	Cables RF/IF:	OK

Luz de Balizaje:	Estado:	N/A
	Cantidad:	0

Pararrayos:	Estado:	OK
-------------	---------	----



Vulcanizado Conectores S2



Vulcanizado Conectores S3

VII.- SISTEMA DE PUESTA A TIERRA:

Estado:	OK
Tipo:	Parre
Cantidad:	4
Resistencia (Ω)	1.74
Topologia :	Malla



Resistencia de SPAT



Pozo a tierra

VIII.- IMAGENES FINALES:



Foto Panorámica del Interior del Site



Resistencia de SPAT



Pozo a tierra

IX.- OBSERVACIONES FINALES:

Ok

N/A

Observacion 1
