




## REPORTE FOTOGRÁFICO - Radio Frecuencia y Transporte

**Nombre de la Estacion:** CAC PRONATEL BARRANCA  
**Nombre de Localidad:** BARRANCA  
**Fecha:** 23/07/2026 - 23/07/2026  
**Dirección:** AV. RAMON CASTILLA N° 243  
**ID site:** CAC PRONATEL BARRANCA  
**CRQ:** CRQ000000103014

### Sticker Año mantenimiento

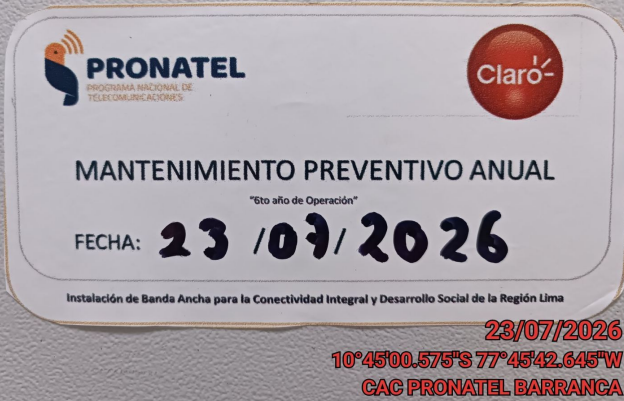


### Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



### EQUIPO BBU, ROUTER O MW: VERIFICAR ESTADO DE EQUIPOS, LED DE ALARMAS, LIMPIEZA TECNICA Y SOPLETADO


#### ANTES

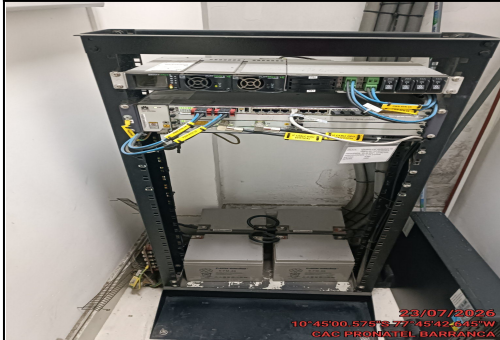

#### DURANTE




#### DESPUES

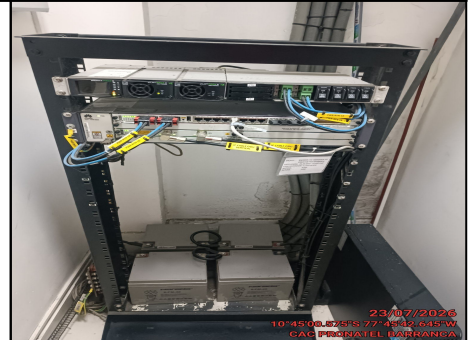

### AJUSTE DE ELEMENTOS Y CONEXIONES


#### ANTES

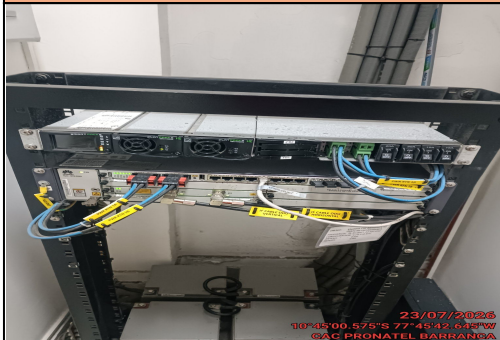

#### DURANTE



#### DESPUES

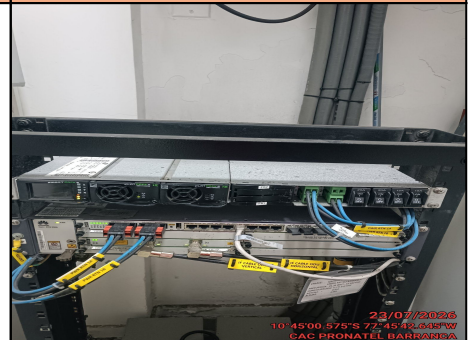

### CABLES: LIMPIEZA TECNICA Y ORDENAMIENTO DE CABLES


#### ANTES



#### DURANTE



#### DESPUES

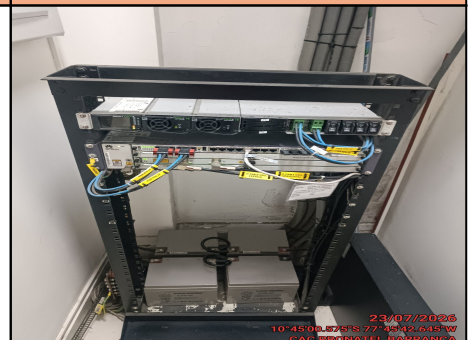

VERIFICACION Y AJUSTE DE ATERRAMIENTO

| ANTES                                                                                                                                                            | DURANTE                                                                                                                                                            | DESPUES                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>23/07/2026<br/>10° 45'00.575"S 77° 45'42.645"W<br/>CAE-PRONATEL BARRANCA</p> |  <p>23/07/2026<br/>10° 45'00.575"S 77° 45'42.645"W<br/>CAE-PRONATEL BARRANCA</p> |  <p>23/07/2026<br/>10° 45'00.575"S 77° 45'42.645"W<br/>CAE-PRONATEL BARRANCA</p> |

VERIFICAR ESTADO DE CONECTORES Y CABLES RRU

| ANTES | DURANTE | DESPUES |
|-------|---------|---------|
| N/A   | N/A     | N/A     |

VERIFICAR ESTADO DE CONECTORES Y CABLES ODU

| ANTES | DURANTE | DESPUES |
|-------|---------|---------|
| N/A   | N/A     | N/A     |

MEDIR EL VSWR MEDIANTE SOFTWARE

| ANTES | DURANTE | DESPUES |
|-------|---------|---------|
| N/A   | N/A     | N/A     |

| CHECKLIST - SISTEMA DE RADIO FRECUENCIA Y TRANSPORTE |        |                                                               |
|------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------|
| Sistema de Detección                                 | Estado |                                                               |
| Router y/o Mw                                        | OK     | Verificar el buen estado del equipo de Transporte             |
|                                                      | OK     | Verificar operatividad de ODU (de aplicar)                    |
|                                                      | OK     | Verificar soportes de RRU y/o ODU (de aplicar)                |
| ENodeB                                               | OK     | Verificar VSWR mediante software                              |
| Tarjetas electrónicas                                | OK     | Verificar el buen estado de las tarjetas electrónicas         |
| Cables                                               | OK     | Verificar la limpieza técnica y el orden de los cables de red |
|                                                      | OK     | Verificar etiquetado y codificación de los cables de red      |
| Aterramiento                                         | OK     | Verificar Línea a tierra de todos los equipos del Sistema     |
| Sistema                                              | OK     | Limpieza general                                              |
| Pruebas Remotas                                      | OK     | Verificar gestión de los equipos desde el NOC                 |
