
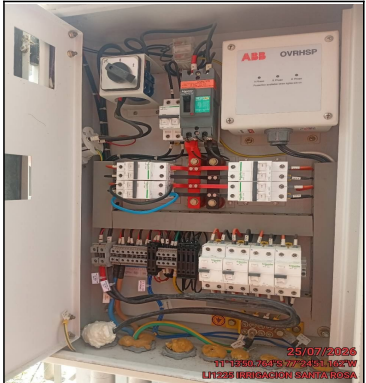


ZONA	SAYAN	NOMBRE SITE:	IRRIGACION SANTA ROSA	CODIGO SITE:	LI1225	FECHA :	2026-07-25 19:09:54
CRQ	CRQ000000103008	COORDENADAS	irrigación santa rosa	TÉCNICO RESPONSABLE	Jhamel Sotelo		

I .- INFRAESTRUCTURA

Site:	Modelo:	greenfield		
	Tipo:	outdoor		
Torre:	Tipo:	ventada		
	Estado:	OK		
	Altura (m):	25		
	Verticalidad:	OK		
	Pintura:	OK		
	Escalera:	OK		
	Línea de vida:	OK		
	Cable Vientos:	OK		
	Grapas:	OK		
	Templadores:	OK		
	Base Templadores:	OK		
	Base de Torre:	OK		
Paredes:	OK			
Concertina:	OK			
Puerta:	OK			
Chapa:	OK			

II .- SUMINISTRO DE ENERGIA AC:

Tipo de Instalacion:	Aérea	
Nivel de Tensión:	LBT	
Sistema de Conexión:	Monofásica	
N° Suministro:	na	
PDP:	Estado: OK	
	Voltaje 1(VAC): 220	
	ITM(A): 50	
	TVSS OK	
	Corriente 1(AAC): 15	

III .- SUMINISTRO DE ENERGIA DC:

Gabinete Rectificador:	Estado:	OK		
	Marca:	huawei		
	Ventiladores:	OK		
	A/A:	OK		
	Filtros:	OK		
Power Core:	Marca:	huawei		
	Modelo:	mts9000a		
	Controlador:			
	Modelo:	smu02b		
	Voltaje (VDC):	51		
	Carga (ADC):	16		
	LVBD/BLVD(VDC):	56		
	LVLd/LLVD(VDC):	56		
	Módulos:	Estado:	OK	
		Modelo1:	r4850	
		Cantidad1:	0	
Bancada Total 1:	Estado:	OK		
	Cantidad:	0		
	Voltaje (V):	51		
	Marca1:	huawei		
	Modelo1:	esm48150		
	Capacidad1(Ah):	150		
	Autonomia (Hr):	16		

IV .- GABINETE DE TRANSMISION:

Gabinete Tx1:

Estado:

Ventiladores:

A/A:

Filtros:

Radios (#):

Routers (#):

Modem (#):

BBU (#):

Switch (#):

Media Converter (#):

OK

OK

OK

OK

1

1

0

1

0

0



Gabinete Tx 1 Abierto



Pasamuro Gabinete Tx 1

V .- BTS:

BBU:

Tipo:

Estado:

FAN:

Cable FO:

BB5900

OK

OK

Estado:

Banda 1 (MHz):

Cantidad:

OK

3500

0

VSWR:


Alarmas Externas:

Alarmas Internas:

OK

OK


OK

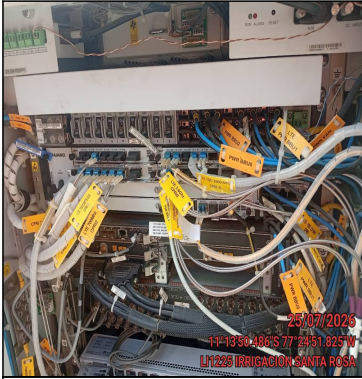


Panoramica de BBU1



Alarmas Internas BBU1

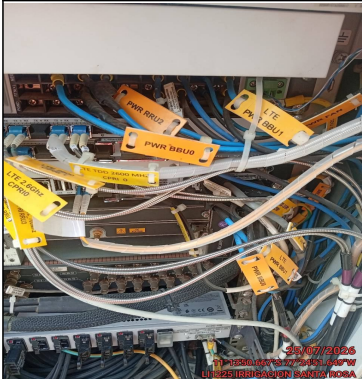

Alarmas Externas



VSWR



Tilt Eléctrico

VI .- SISTEMA RADIANTE:

Antenas:

Sectoriales TDD:	Estado:	OK
	Cantidad:	2
	Modelo:	na
	Tilt m.1(°):	OK

Microondas:	Estado:	OK
	Cantidad:	1



Torre



Vulcanizado Conectores S1

RRU	Cantidad:	2
	Conectores:	OK
	Cables RF/IF:	OK

Luz de Balizaje:	Estado:	OK
	Cantidad:	1

Pararrayos:	Estado:	OK
-------------	---------	----



Vulcanizado Conectores S2



Vulcanizado Conectores S3

VII.- SISTEMA DE PUESTA A TIERRA:

Estado:	OK
Tipo:	único
Cantidad:	4
Resistencia (Ω)	3
Topologia :	mallá



Resistencia de SPAT



Pozo a tierra


VIII.- IMAGENES FINALES:



Foto Panorámica del Interior del Site



Resistencia de SPAT

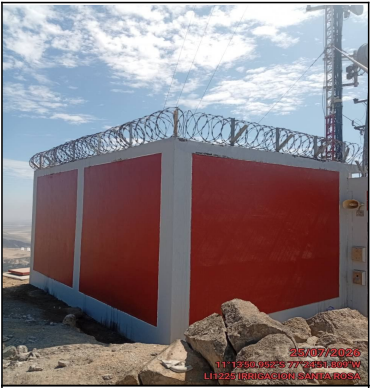

Pozo a tierra

IX.- OBSERVACIONES FINALES:

naa

N/A

Observacion 1
